

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор
 Форма по ОКУД
 Код
 0322005

Заказчик (Генподрядчик)
 ООО "УРСАДОМ" 654007, г.Новокузнецк, ул.Павловского, д.1А

Подрядчик (Субподрядчик)
 ООО "ТС-Строй" г.Новосибирск, ул.Кирова, 29/1 оф.1

Стройка:
 Благоустройство дворовых территорий МКД по г.Новокузнецк

Объект:
 Благоустройство дворовой территории по адресу: г.Новокузнецк, ул.Циолковского,5 (минимальный перечень)

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракта)
 номер 52/18
 дата 03 09 2018
 Вид операции
 Отчетный период
 с 03.09.2018 по 30.10.2018

Номер документа	Дата составления
1	30.10.2018

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.		Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч		
			всего	экс. маш.	всего	экс. маш.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е68-14-1 Разборка бортовых камней на бетонном основании БР.100.30.18, 100 м	0,7	1 417,77 708,54	709,23 113,55	992	496	496	68,26 9,4	47,782 6,58
	Накладные расходы	104			598				
	Сметная прибыль	60			345				
2	Е68-12-8	0,195	11 523,91	11 431,43	2 247	18	2 229	9,87	1,92465

Заготовительно-складские расходы 2%, транспортные расходы 10,3%

Раздел 1. Ремонт дворовых проездов

Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм, 1000 м2 покрытия	92,48	249,25	49	15,51	3,02445
<i>Накладные расходы</i>	104		70		
<i>Сметная прибыль</i>	60		40		
3. Т01-01-01-043	13,78	4,49	53	0,024	0,33
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза		3,87 0,39	5		
Объем: 70*0,12+0,032*70*2,4					
<i>в т.ч. Накладные расходы</i>	100		5		
<i>в т.ч. Сметная прибыль</i>	60		3		
4. Т03-21-01-015	40,81	15,36	627		
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза		15,36			
Объем: 13,78+(195*0,07*1,98)					
5. E27-04-001-03	0,0324	4 617,09	150	145	0,413748
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного (под дорожные бордюры: из щебня фр. 0-10мм толщ. 15см), 100 м3 материала основания (в плотном теле)		121,95 478,22	4	15	12,77 29,74 0,96
Объем: 72,1*0,3*0,15					
<i>Накладные расходы</i>	142		27		
<i>Сметная прибыль</i>	81		15		
6. С Прайс "СГМК".	4,09	65,02	266		
Щебень из доменного шлака фр. 5-20 т.ч. прил. 27.2 (374,87*1,02*1,103), м3					
Объем: 72,1*0,3*0,15*1,26					
Поправки: М: =374.87*1.103*1.02/6.48					
7. E27-02-010-02	0,721	4 424,18	3 189	75	54,85368
		104,20	557	76,08	

Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П-1У, П-1У-1), 100 м бортового камня	772,97	11,02	8	0,68	0,49028
Вычт.ресурсы: С101-1805:[M-(10.56=10557.18*0.001)]; С102-0038:[M-(119.87=705.14*0.17)]					
Накладные расходы	142		802		
Сметная прибыль	81		458		
8. Е06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,0361	<u>4 296,39</u> 1 686,60	-155	-61	<u>180</u> -0,65
Объем: -0,5*0,1*72,1					
Вычт.ресурсы: С101-1668:[M-(2412.50=9.65*250)]; С411-0001:[M-(0.40=1.98*0.2)]					
Накладные расходы	105		-76		
Сметная прибыль	55		-40		
9. С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	-3,6822	<u>594,11</u>	-2 188		
Объем: -0,0361*102,0					
10. С. Прайс Авангар Поробрик П-1У (10907*1,02*1,103), м3	3,79	<u>1 604,81</u>	6 082		
Объем: 72,1*0,0525					
Поправки: М: =10907*1.103*1.02/6.48/1.18					
11. Е27-04-001-03 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного,(Фр.0- 10мм), 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1	<u>4 617,09</u> 121,95	462	12	<u>12,77</u> 2,97
Объем: 195*0,05					
Накладные расходы	142		85		
Сметная прибыль	81		49		
12. С Прайс "СГМК". Щебень из доменного шлака фр. 5-20 т.ч. прил. 27.2 (374,87*1,02*1,103), м3	12,29	<u>65,02</u>	800		
Объем: 195*0,05*1,26					
Поправки: М: =374.87*1.103*1.02/6.48					
13. Е27-06-026-01	0,1	<u>1 981,77</u>	198		
		<u>49,08</u>			<u>5</u>

Розлив вяжущих материалов, 1 т 8,59 1 0,66 0,07

Объем: 195*0,0005

<i>Накладные расходы</i>	142	1					
<i>Сметная прибыль</i>	81	1					

14. E27-03-004-01	0,1872	55 854,67	3 067,84	10 456	48	574	21,77	4,075344
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, 100 т смеси		255,36	356,69			67	21,5	4,02

Объем: 195*0,04*2,4

<i>Накладные расходы</i>	142	163						
<i>Сметная прибыль</i>	81	93						

15. E27-06-020-01	0,195	3 437,90	2 769,94	670	86	540	38,3	7,4685
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия		442,75	315,39			62	19,08	3,7206

<i>Накладные расходы</i>	142	210						
<i>Сметная прибыль</i>	81	120						

16. E27-06-021-01	-0,39	7,39	3,72	-2		-1	0,09	-0,0351
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01(до толщ 3 см: к=-2), 1000 м2 покрытия		1,04						

Объем: -2*195

17. С410-0006	14,12	570,70		8 058				
---------------	-------	--------	--	-------	--	--	--	--

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, Т

Объем: (96,6-2*12,1)*0,195

18. E47-01-046-04	0,25	2 061,55		516	96		40	10
Подготовка почвы для устройства партерного и обычного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2		382,00						
<i>Накладные расходы</i>	115	110						
<i>Сметная прибыль</i>	77	74						

ИТОГО ПО АКТУ	32 429	1 256	5 096	121,261822
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	31 741	1 256	4 416	21,524626
МАТЕРИАЛОВ -	8 058	318		121,261822
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2; %=142 - по стр. 5, 7, 11, 13-15; %=105 - по стр. 8; %=115 - по стр. 18)	1 990			21,193906
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 5, 7, 11, 13-15; %=55 - по стр. 8; %=77 - по стр. 18)	1 155			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	34 886			
Расчет стоимости работ в текущем уровне цен на январь 2018 г. Протокол № 01И -2018 от 12.01.2018	27 856			
Строительные работы ТЦ ЭП	22,178			
Строительные работы ТЦ ЭПМ	7 053			
Строительные работы ТЦ ЭМ	28 108			
Строительные работы ТЦ материалы	193 464			
Строительные работы ТЦ НР	36 103			
Строительные работы ТЦ СП	19 722			
Строительные работы ТЦ всего	305 253			
СТОИМОСТЬ ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ	61		53	
В Т.ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)	5		5	0,33072
В Т.ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)	3			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ -	61			
Погрузка-разгрузка ТЦ ЭПМ	22,178			
Погрузка-разгрузка ТЦ ЭМ	6,365			
Погрузка-разгрузка ТЦ в т.ч. НР	22,178			
Погрузка-разгрузка ТЦ в т.ч. СП	22,178			
Погрузка-разгрузка ТЦ всего	521			
ПЕРЕВОЗКА (таб.8)	627		627	
Перевозка (таб.8) ТЦ	6 558			
Перевозка ТЦ всего	6 558			
ВСЕГО ПО АКТУ	35 574			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 995			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 158			
Оплата основных рабочих ТЦ	27 856			
Оплата механизаторов ТЦ	7 164			
Стоимость механизмов ТЦ	28 445			

Инвестор
 Форма по ОКУД
 Код
 0322005

Инвестор _____ по ОКПО _____

Заказчик (Генподрядчик)
 ООО "УРСАДОМ" 654007, г.Новокузнецк, ул.Павловского, д.1А _____ по ОКПО _____

Подрядчик (Субподрядчик)
 ООО "ИС-Строй" г.Новосибирск, ул.Кирова,29/1 оф.1 _____ по ОКПО _____

Стройка:
 Благоустройство дворовых территорий МКД по г.Новокузнецк _____

Объект:
 Благоустройство дворовой территории по адресу: г.Новокузнецк, ул.Циолковского,5 (дополнительный перечень) _____

Вид деятельности по ОКДП _____

Договор подряда (контракта) _____ Вид операции _____

номер _____ дата _____ 52/18 _____

Отчетный период _____

с _____ по _____

03.09.2018 _____ 03.10.2018 _____

2 _____ 30.10.2018 _____

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.		Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч		
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда осн. раб.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед. всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заготовительно-складские расходы 2%, транспортные расходы 10,3%

Ремонт автомобильных парковок

1. Е68-3-5	6,49	56,66	17,92	368	251	117	3,84	24,922
Валка деревьев в городских условиях (карагачклен, ясень) диаметром до 300 мм, 1 складочный м3 кряжей		38,67						

Накладные расходы 104
 Сметная прибыль 60

2. Е01-02-105-02	0,06	670,64	670,64	40	40	4,14	0,248
Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см, 100 пней			71,62		4		
Накладные расходы	80			3			
Сметная прибыль	38			2			
3. Е01-02-107-01	0,06	295,40	295,40	18	18	2,33	0,14
Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) (под проезжей частью), 100 ям			37,77		2		
Накладные расходы	80			2			
Сметная прибыль	38			1			
4. С Прайс "СТМК". Щебень из доменного шлака фр. 40-70 т.ч. прил. 27.2 (351,84*1,02*1,103), м3	0,95	61,02		58			
Поправки: М: =351.84*1.103*1.02/6.48							
5. Т01-01-01-007	3,96	16,72	8,78	67	10	0,249	0,986
Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого, 1 т груза		2,55	0,86		3	0,062	0,25
Объем: (6,49)*0,61							
в т.ч. Накладные расходы	100			14			
в т.ч. Сметная прибыль	60			8			
6. Т01-01-01-043	0,58	4,49	3,87	2	2	0,024	0,01
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза			0,39				
Объем: 0,95*0,61							
7. Т03-21-01-015	4,54	15,36	15,36	70	70		
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 15 км, 1 т груза							
Объем: 3,96+0,58							

Объем: 62,5+10

Вычт.ресурсы: C101-1805:[M-(10.56=10557.18*0.001)]; C102-0038:[M-(119.87=705.14*0.17)]

Накладные расходы

807

Сметная прибыль

460

14. E06-01-001-01	-0,03625	4 296,39	2 609,79	-156	-61	180	-95	18	-0,65	-6,525
Устройство бетонной подготовки, 100 м3		1 686,60	291,78				-11			
бетона, бутобетона и железобетона в деле										

Объем: -0,5*0,1*72,5

Вычт.ресурсы: C101-1668:[M-(2412.50=9.65*250)]; C411-0001:[M-(0.40=1.98*0.2)]

Накладные расходы

-76

Сметная прибыль

-40

15. C401-0006	-3,6975	594,11		-2 197						
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3										

Объем: -0,03625*102,0

16. С. Прайс Авангард	3,28	1 604,81		5 264						
Поребрик П-1У (10907*1,02*1,103), м3										

Объем: 62,5*0,0525

Поправки: М: =10907*1.103*1.02/6.48/1.18

17. С.Прайс Авангард	0,525	1 769,23		929						
Поребрик П-1У-1 (12024,46*1,02*1,103), м3										

Объем: 10*0,0525

Поправки: М: =12024.46*1.103*1.02/6.48/1.18

18. E27-04-001-03	0,3951	4 617,09	4 465,64	1 824	48	1 764	189	29,74	11,8	5,045
Устройство подстилающих и		121,95	478,22							
выравнивающих слоев оснований из шлака										
доменного отвального сталеплавильного,										
(фр. 40-70 толщ. 15см ,), 100 м3 материала										
основания (в плотном теле)										

Объем: 263,4*0,15

Накладные расходы

337

Сметная прибыль

192

19. С Прайс "СГМК".	49,78	61,09		3 041						
Щебень из доменного шлака фр. 40-70 т.ч.										
прил. 27.2 (351,84*1,02*1,103), м3										

Объем: 263,4*0,15*1,26

Поправки: М: =351.87*1.103*1.02/6.48

20. E27-04-001-03	0,21072	<u>4 617,09</u> 121,95	<u>4 465,64</u> 478,22	973	26	<u>941</u> 101	<u>12,77</u> 29,74	<u>2,691</u> 6,27
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного, (фр. 20-40мм толщ. 8см), 100 м3 материала основания (в плотном теле)								
Объем: 263,4*0,08								
<i>Накладные расходы</i>	142			180				
<i>Сметная прибыль</i>	81			103				
21. С Прайс "СГМК". Щебень из доменного шлака фр. 20-40 т.ч. прил. 27.2 (351,84*1,02*1,103), м3	26,55	<u>61,09</u>		1 622				
Объем: 263,4*0,08*1,26								
Поправки: M: =351.84*1.103*1.02/6.48								
22. E27-06-020-06	0,2634	<u>3 259,67</u> 442,75	<u>2 761,87</u> 314,90	859	117	<u>727</u> 83	<u>38,3</u> 19,05	<u>10,088</u> 5,018
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия								
<i>Накладные расходы</i>	142			284				
<i>Сметная прибыль</i>	81			162				
23. С410-0022	24,36	<u>518,60</u>		12 633				
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II, Т								
Объем: 92,5*0,2634								
24. E27-06-020-01	0,2634	<u>3 437,90</u> 442,75	<u>2 769,94</u> 315,39	906	117	<u>730</u> 83	<u>38,3</u> 19,08	<u>10,088</u> 5,026
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АББ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия								
<i>Накладные расходы</i>	142			284				
<i>Сметная прибыль</i>	81			162				
25. E27-06-021-01	-0,5268	<u>7,39</u>	<u>3,72</u>	-4	-1	-2	<u>0,09</u>	<u>-0,047</u>

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (до толщ 3см К=2), 1000 м2 покрытия	1,04								
Объем: -2*263,4									
<i>Накладные расходы</i>	142	-1							
<i>Сметная прибыль</i>	81	-1							
26. С410-0006	19,07	570,70	10 883						
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б, Т									
Объем: (96,6-2*12,1)*0,2634									
27. Е47-01-046-04	0,724	2 061,55	1 493	277	40				28,96
Подготовка почвы для устройства партерного и обычного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2		382,00							
<i>Накладные расходы</i>	115		319						
<i>Сметная прибыль</i>	77		213						
Ремонт тротуаров, отмстки									
28. Е68-13-2	0,12	1 761,52	211	69	142	57,76			6,931
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических, 1000 м2		577,02			23	15,7			1,884
<i>Накладные расходы</i>	104		96						
<i>Сметная прибыль</i>	60		55						
29. Е01-02-057-02	0,0655	1 442,98	95	95	154				10,087
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта		1 442,98							
Объем: 65,5*0,1									
<i>Накладные расходы</i>	80		76						
<i>Сметная прибыль</i>	38		36						
30. Т01-01-01-043	20,967	4,49	94						81
		3,87							

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	0,39	8	0,024	0,5				
Объем: (120*0,04*1,98)+65,5*0,1*1,75 в т.ч. Накладные расходы в т.ч. Сметная прибыль	100 60	8 5						
31. Т03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	20,967	322	15,36	15,36	322			
32. Е27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под роутеры из кирпичного или известнякового щебня (тротуарные бордюры из щебня фр. 0-10мм), 100 м2 дорожек и тротуаров	0,4168	247	592,78 266,60	322,22 42,03	111 18	134 18	26,24 3,17	10,937 1,32
Объем: 208,4*0,2 Вычт.ресурсы: С408-0391:[М-(4660.42=267.84*17.4)] Накладные расходы Сметная прибыль	142 81	183 104						
33. Е27-07-002-02 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ.10см к=-2), 100 м2 дорожек и тротуаров	-0,8336	-12	14,02 5,49	8,53 1,21	-5	-7 -1	0,54 0,1	-0,45 -0,08
Объем: -2*208,4*0,2 Вычт.ресурсы: С408-0391:[М-(401.76=267.84*1.5)] Накладные расходы Сметная прибыль	142 81	-9 -5						
34. С Прайс "СГМК". Щебень из доменного шлака фр. 5-20 т.ч. прил. 27.2 (374,87*1,02*1,103), м3	5,25	342	65,09					
Объем: 208,4*0,2*0,1*1,26 Поправки: М: =374,87*1.103*1.02/6.48								
35. Е27-02-010-02	2,084	9 220	4 424,18	104,20	1 611	217	76,08	158,551

Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П-5У), 100 м бортового камня	772,97	11,02	23	0,68	1,417
Вычт.ресурсы: С101-1805:[M-(10.56=10557.18*0.001)]; С102-0038:[M-(119.87=705.14*0.17)]					
Накладные расходы	142	2 320			
Сметная прибыль	81	1 324			
36. Е06-01-001-01	-0,1042	2 609,79	-272	180	-18,756
Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	1 686,60	291,78	-30	18	-1,88
Объем: -(0,5*0,1*208,4)					
Вычт.ресурсы: С101-1668:[M-(2412.50=9.65*250)]; С411-0001:[M-(0.40=1.98*0.2)]					
Накладные расходы	105	-216			
Сметная прибыль	55	-113			
37. С401-0006	-10,6284	594,11			
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3					
Объем: -0,1042*102,0					
38. С.Прайс Авангард	4,3764	1 915,27			
Поребрик П-5у (13017*1,02*1,103), м3					
Объем: 208,4*0,021					
Поправки: М: =13017*1.103*1.02/6.48/1.18					
39. Е27-07-002-01	0,655	322,22	211	26,24	17,187
Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 20-40мм), 100 м2 дорожек и тротуаров	266,60	42,03	28	3,17	2,076
Вычт.ресурсы: С408-0391:[M-(4660.42=267.84*17.4)]					
Накладные расходы	142	288			
Сметная прибыль	81	164			
40. Е27-07-002-02	-1,31	8,53	-11	0,54	-0,707
На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ.10см к=-2), 100 м2 дорожек и тротуаров	5,49	1,21	-2	0,1	-0,13
Объем: -2*65,5					
Вычт.ресурсы: С408-0391:[M-(401.76=267.84*1.5)]					
Накладные расходы	142	-13			
Сметная прибыль	81	-7			

41. С Прайс "СГМК". Щебень из доменного шлака фр. 20-40 т.ч. прил. 27.2 (351,84*1,02*1,103), м3	8,25	<u>61,09</u>	504						
Объем: 65,5*0,10*1,26									
Поправки: M: =351.84*1.103*1.02/6.48									
42. E27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под трогуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 0-10мм), 100 м2 дорожек и трогуаров Вычт.ресурсы: С408-0391:[M-(4660.42=267.84*17.4)] Накладные расходы Сметная прибыль	2,164	<u>592,78</u> 266,60	1 283	577	<u>697</u> 91	<u>26,24</u> 3,17	<u>56,783</u> 6,86		
43. E27-07-002-02 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ.10см к=-2) , 100 м2 дорожек и тротуаров Объем: -2*216,4 Вычт.ресурсы: С408-0391:[M-(401.76=267.84*1.5)] Накладные расходы Сметная прибыль	-4,328	<u>14,02</u> 5,49	-61	-24	<u>-37</u> -5	<u>0,54</u> 0,1	<u>-2,337</u> -0,43		
44. С Прайс "СГМК". Щебень из доменного шлака фр. 5-20 т.ч. прил. 27.2 (374,87*1,02*1,103), м3	27,27	<u>65,09</u>	1 775						
Объем: 216,4*0,1*1,26									
Поправки: M: =374.87*1.103*1.02/6.48									
45. E27-07-001-04 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (отмостка), 100 м2 покрытия Вычт.ресурсы: С410-0054:[M-(3940.42=551.88*7.14)] Накладные расходы Сметная прибыль	1,309	<u>304,01</u> 118,03	398	155	<u>96</u>	<u>10,21</u> 0,02	<u>13,365</u> 0,026		
46. E27-07-001-02	2,618	<u>37,64</u>	99	68	<u>31</u>	<u>2,32</u>	<u>6,074</u>		

25,89

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(до толщ. 4см к=2), 100 м2 покрытия

Объем: 2*130,9

Вычт.ресурсы: С410-0054:[M-(667.77=551.88*1.21)]

Накладные расходы

142

97

Сметная прибыль

81

55

7 139

570,70

12,51

47. С410-0006
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, Т

Объем: (7,14+1,21*2)*1,309

392

4 375,98

0,0855

4 582,74

18

18,58

1,589

11

126,32

204,94

374

7,98

0,682

Накладные расходы

142

41

Сметная прибыль

81

23

104

1 876,40

0,055575

49. С101-1556
Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, Т

Объем: 0,08555*0,65

4 663

570,70

8,17

50. С410-0006
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, Т

Объем: (7,14+1,21*2)*0,855

4 296

2 061,55

2,084

51. Е47-01-046-04
Подготовка почвы для устройства партерного и обычного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2

Накладные расходы

115

915

40

83,36

· ИТОГО ПО АКТУ	78 371	4 811	9 392	474,396
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	74 942	4 801	717	46,367
· МАТЕРИАЛОВ -	35 318		641	41,594
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 28; %=80 - по стр. 2, 3, 29; %=95 - по стр. 8; %=142 - по стр. 11, 13, 18, 20, 22, 24, 25, 32, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48; %=105 - по стр. 14, 36; %=115 - по стр. 27, 51)	4 318			
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 28; %=38 - по стр. 2, 3, 29; %=43 - по стр. 8; %=81 - по стр. 11, 13, 18, 20, 22, 24, 25, 32, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48; %=55 - по стр. 14, 36; %=77 - по стр. 27, 51)	86 604			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				
Расчет стоимости работ в текущем уровне цен на январь 2018 г. Протокол № 01И -2018 от 12.01.2018	106 477			
Строительные работы ТЦ ЗП	14 216			
Строительные работы ТЦ ЗПМ	38 903			
Строительные работы ТЦ ЭМ	462 754			
Строительные работы ТЦ материалы	138 673			
Строительные работы ТЦ НР	76 627			
Строительные работы ТЦ СП	823 434			
Строительные работы ТЦ всего	913	10	764	0,986
СТОИМОСТЬ ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ			76	4,773
· В Т.ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 5, 9, 30)	87			
· В Т.ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 5, 9, 30)	52			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ -	913			
Погрузка-разгрузка ТЦ ЗП	222			
Погрузка-разгрузка ТЦ ЗПМ	1 686			
Погрузка-разгрузка ТЦ ЭМ	4 863			
Погрузка-разгрузка ТЦ в т.ч. НР	1 926			
Погрузка-разгрузка ТЦ в т.ч. СП	1 156			
Погрузка-разгрузка ТЦ всего	8 167			
ПЕРЕВОЗКА (таб.8)	2 516			
Перевозка (таб.8) ТЦ	26 317			
Перевозка ТЦ всего	26 317			
· ВСЕГО ПО АКТУ	90 033		2 516	

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Оплата основных рабочих ТЦ

Оплата механизаторов ТЦ

Стоимость механизмов ТЦ

Стоимость материалов ТЦ

Перевозка ТЦ

ИТОГО ТЦ

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ

ВСЕГО ТЦ

Строительный контроль

Итого ТЦ

НДС

Итого с НДС

Итого к оплате согласно договора №52/18 от 03.09.2018Б протокола от от 21.09.2018, №21 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом снижения сумма по акту

Федеральный бюджет %

Областной бюджет %

Муниципальный бюджет %

Заинтересованные лица %

Итого к оплате

В том числе НДС

7 431

4 370

106 699

15 902

43 766

462 754

26 317

639 536

140 599

77 783

857 918

18 359

876 277

157 730

1 034 007

986 124,27

453 034,05

248 100,30

77 903,82

207 086,10

986 124,27

150 425,74

64,614442195265097


10

21

Областной бюджет %
Муниципальный бюджет %
Заинтересованные лица %
Итого к оплате
В том числе НДС

Итого к оплате

В том числе НДС



Ген. директор ООО "ТС-Строй"


Принял: Директор ООО "УРСАДОМ"

Принял: Директор МБУ "Дирекция ЖХ"

Председатель совета МБУ:

Объемы

Расценки

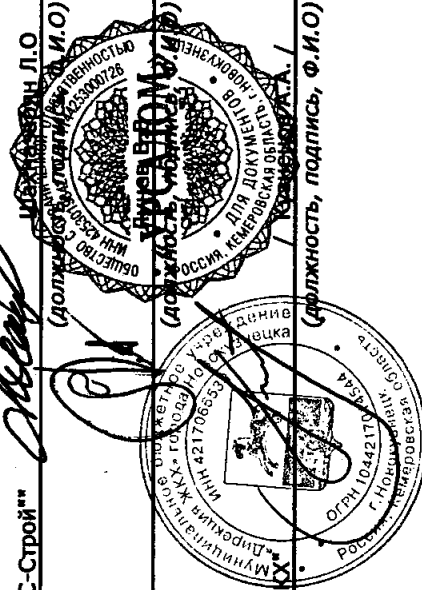

(должность, подпись, Ф.И.О)
