Договор подряда 8/3-2023
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, включенной в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы"

г. Новокузнецк "20" октября 2022 года

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Престиж-НК», в лице директора Кашириной Светланы Сергеевны, действующего на основании Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «НК- Стройпродукт» в лице директора Зарудневой Натальи Александровны , действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), со второй стороны, Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция ЖКХ" города Новокузнецка в лице директора Криулькина Сергея Викторовича, (действующего на основании Решения (далее - Строительный контроль), с третьей стороны, и Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка в лице председателя Либера Максима Владимировича, действующего на основании Распоряжения (далее - Плательщик), с четвертой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании постановления администрации города Новокузнецка от 11.04.2018 № 62 "Об организации мероприятий по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы" (далее - Постановление № 62), а также протокола об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы" №8 от 14.10.2022, заключили настоящий договор подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу (далее также - объект): **г. Новокузнецк, ул. Ленина, д. 15,** в соответствии с дизайн-проектом благоустройства дворовой территории, локальным сметным расчетом стоимости работ по благоустройству объекта (далее - работы) и передать результат работы Заказчику, Заказчик совместно со Строительным контролем обязуется принять результат выполненных работ, а Плательщик - оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Наименование работ, описание (характеристика) работ, а также сроки выполнения подрядных работ являются существенными условиями Договора и указываются в приложениях к настоящему Договору:

1) графике выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (приложение № 1 к настоящему Договору);

2) дизайн-проекте благоустройства дворовой территории (приложение № 4 к настоящему Договору);

3) локальном сметном расчете стоимости работ по благоустройству дворовой территории (приложение № 5 к настоящему Договору).

1.3. Работы должны быть выполнены Подрядчиком лично, с использованием своих материалов, своими силами и средствами, а также качественно и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.4. Термины и понятия в настоящем Договоре используются в значении терминов и понятий, определенных в Порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы, утвержденном постановлением администрации города Новокузнецка от 11.04.2018 № 62.

2. Цена Договора, порядок и условия оплаты работ

2.1. Стоимость работ по Договору определяется в результате проведения основного этапа открытого конкурса. Цена, предложенная Подрядчиком по настоящему Договору, составляет **4 042 282,86 рублей (четыре миллиона сорок две тысячи двести восемьдесят два рубля восемьдесят шесть копеек),** НДС 20% (НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения). Указанная цена увеличению не подлежит.

2.2. В цену Договора включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.

2.3. Окончательная стоимость работ определяется по представляемой Подрядчиком исполнительной документации, включающей в себя:

1) акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - акты по форме КС-2);

2) справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее - справки по форме КС-3);

3) документы, подтверждающие стоимость материалов и механизмов (счета-фактуры на материалы с приложением товарно-транспортных накладных). Стоимость материалов не должна превышать стоимость, применяемую при расчете локальных сметных расчетов стоимости работ;

4) сертификаты на основные материалы;

5) счета-фактуры на выполненные работы;

6) акты освидетельствования скрытых работ;

7) протоколы результатов испытаний асфальтобетонного покрытия;

8) общий журнал производства работ;

9) фотографии (до и после выполнения работ (на одном листе), 2 фото формата А4 в цветном изображении, снятых из одной точки);

10) гарантийный паспорт на объект;

11) исполнительную съемку для подтверждения объемов.

Исполнительная документация, указанная в подпунктах 1 - 5 настоящего пункта, должна соответствовать унифицированным формам, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100.

2.4. Оплата выполненных работ по благоустройству объекта осуществляется Плательщиком по объектам, указанным в пункте 1.1 настоящего Договора, и в пределах сумм в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Договора в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением о предоставлении субсидии, а также Соглашением об аккумулировании и расходовании денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального или минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий. Оплата производится при условии выполнения работ в полном объеме надлежащего качества в срок не позднее 10 рабочих дней после получения Плательщиком от Подрядчика подписанного сторонами акта приемки выполненных работ на дворовой территории по унифицированной форме КС-2, акта приемки объекта в эксплуатацию, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ утверждаются на основании графика выполнения работ согласно приложению № 1 к настоящему Договору. Общий срок выполнения работ составляет:

1) начало работ – 01.05.2023;

2) окончание работ – 29.07.2023.

3.2. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

4. Обязанности и права Заказчика

4.1. При выполнении Договора Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Подрядчику по акту приема-передачи земельный участок в кадастровых границах дворовой территории с элементами благоустройства, проектно-сметную документацию в период с 15.04.2023 по 30.04.2023.

4.1.2. Обеспечить согласование проведения работ с ресурсоснабжающими организациями.

4.1.3. Создать приемочную комиссию (отдельно на каждый объект), в состав которой включить и обеспечить явку представителей собственников помещений в многоквартирных домах, Строительного контроля, членов общественной комиссии.

4.1.4. Обеспечить контроль за ходом выполняемых работ приемочной комиссией.

4.1.5. Осуществлять контроль за ходом выполняемых работ: на соответствие работ дизайн-проекту благоустройства дворовой территории и сметной документации, а также контроль за качеством и сроками выполняемых работ. В случае выявления соответствующих нарушений письменно уведомить об этом Стороны по Договору.

4.1.6. Обеспечивать еженедельный осмотр объекта членами приемочной комиссии в составе не менее половины от утвержденного состава. Замечания и письменные указания по результатам осмотра фиксируются в журнале производства работ, а также в Акте выявленных замечаний в процессе благоустройства дворовых территорий.

4.1.7. Осуществить освидетельствование скрытых работ и подписание соответствующих актов приемочной комиссией.

4.1.8. Проводить проверку документации (технических паспортов, сертификатов и пр.) на используемые строительные материалы, оборудование, изделия и конструкции.

4.1.9. Осуществлять контроль за устранением дефектов при производстве работ по факту их выполнения.

4.1.10. Организовать приемку приемочной комиссией выполненных работ, приемку этапов работ согласно графику выполнения работ, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, приемку объекта в эксплуатацию.

4.1.11. Участвовать в приемочной комиссии по приемке видов, этапов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, по приемке выполненных работ с подписанием акта по форме КС-2, справки по форме КС-3, акта приемки объекта в эксплуатацию.

4.1.12. Осуществлять контроль по применению расценок при оформлении работ по форме КС-2.

4.1.13. Принять подписанные Подрядчиком акты по форме КС-2, справки по форме КС-3 и счета-фактуры в 5 экземплярах и, в случае отсутствия замечаний, подписать.

4.1.14. После подписания акта по форме КС-2 Заказчик и представитель собственников помещений подписывают акт приема-передачи объектов для последующего их содержания и ремонта за счет средств заинтересованных лиц.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Назначить уполномоченного представителя во взаимоотношениях Сторон по настоящему Договору с обязательным письменным уведомлением соответствующих Сторон об этом.

4.2.2. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

4.2.3. Предъявлять претензии и требовать от Подрядчика уплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащие исполнение настоящего Договора, возмещения ущерба, причиненного третьим лицам в ходе выполнения работ и (или) в течение гарантийного срока на выполняемые работы.

4.2.4. Участвовать совместно с Подрядчиком и Строительным контролем в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами по Договору.

5. Обязанности и права Подрядчика

5.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

5.1.1. Принять от Заказчика по акту приема-передачи объект в срок, указанный в подпункте 4.1.1 пункта 4.1 Договора.

5.1.2. В течение одного рабочего дня с даты заключения настоящего Договора назначить (приказом/распоряжением) своего представителя, ответственного за производство работ, письменно сообщив Заказчику, Строительному контролю: ФИО назначенного лица, номер телефона, а также иные контактные данные, необходимые для наличия круглосуточной возможности оперативной связи между представителем Строительного контроля и ответственным представителем Подрядчика.

5.1.3. До начала выполнения работ на объекте представить Заказчику, Строительному контролю, Плательщику персональный график выхода бригад согласно приложению № 2 к настоящему Договору.

5.1.4. Не позднее чем за один рабочий день до начала выполнения этапа работ, поставки материалов уведомить Заказчика и Строительный контроль.

5.1.5. Самостоятельно либо путем привлечения сторонних организаций поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы (в том числе товарно-транспортные накладные), удостоверяющие качество и поставщика используемых материалов.

5.1.6. Разместить за свой счет на ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов согласно утвержденной форме, размещенной на официальном сайте Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Новокузнецка во вкладке "Формирование комфортной городской среды".

5.1.7. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан.

5.1.8. Обеспечить за свой счет ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию и выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, не препятствуя перемещению граждан по дворовой территории и свободному доступу к входу и выходу из многоквартирного дома.

5.1.9. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих или делающих невозможным продолжение работ, поставить об этом в известность стороны договора, письменно сообщив об этом.

5.1.10. Выполнить работу качественно, в соответствии с дизайн-проектом благоустройства дворовой территории, в объемах и в сроки, предусмотренные договором, и сдать работу в состоянии, соответствующем условиям договора и обеспечивающем нормальную эксплуатацию объекта.

5.1.11. Обеспечивать своевременную уборку отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, акта по форме КС-2.

5.1.12. По первому требованию представителей Заказчика и

Строительного контроля представлять всю необходимую информацию и документацию, в том числе представлять отчеты о ходе выполнения работ по Договору.

5.1.13. Обеспечить представителю Заказчика и Строительного контроля необходимые условия для исполнения им своих обязанностей и реализации прав на объекте.

5.1.14. При сдаче объекта в эксплуатацию передать Заказчику (представителю Заказчика) общий журнал производства работ, исполнительные чертежи (топографическая съемка), акт по форме КС-2, справку по форме КС-3, акты освидетельствования скрытых работ, протоколы испытаний асфальтобетонной смеси, фотографии и иные документы, перечисленные в пункте 2.6 Договора.

5.1.15. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в сроки, согласованные с уполномоченным представителем Заказчика и (или) Строительного контроля.

5.1.16. Обеспечить удаленное видеонаблюдение за ходом выполнения работ на объекте в соответствии с п. 5.7.1 приложения № 3 к Постановлению № 62.

5.1.17. Уведомить в течение 2 (двух) рабочих представителей Заказчика, Строительного контроля, членов приемочной комиссии о завершении работ по Договору в соответствии с п. 8.1 настоящего Договора.

5.1.18. Обеспечить непрерывность проведения строительных работ на объекте с обязательным наличием на строительной площадке необходимых материалов, технических средств, рабочего персонала в период проведения работ в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему Договору, с учетом п. 5.1.7 настоящего Договора.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Назначить уполномоченного представителя во взаимоотношениях Сторон по настоящему Договору с обязательным письменным уведомлением соответствующих Сторон об этом.

5.2.2. Требовать своевременную приемку выполненных работ по Договору.

5.2.3. Получить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.4. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или

создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику, Строительному контролю в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнения работ.

5.2.5. Участвовать совместно с Заказчиком и Строительным контролем в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами по Договору.

6. Права и обязанности Строительного контроля

6.1. При выполнении Договора Строительный контроль обязан:

6.1.1. Организовать работу горячей линии по телефону для собственников многоквартирного дома по вопросам, связанным с выполнением работ по благоустройству объекта.

6.1.2. Еженедельно представлять Плательщику отчет о ходе выполнения работ и о работе горячей линии.

6.1.3. Осуществлять контроль за ходом выполняемых работ на соответствие дизайн-проекту благоустройства дворовой территории и сметной документации, фактическим объемам и качеству. Замечания и письменные указания по ходу выполнения работ фиксировать в журнале производства работ.

6.1.4. Контролировать соблюдение графика выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома согласно приложению № 1 к настоящему Договору. В случае его несоблюдения Подрядчиком письменно уведомлять об этом Заказчика и Плательщика.

6.1.5. Осуществлять контроль за устранением замечаний и дефектов, выявленных в ходе и по факту выполнения работ по Договору.

6.1.6. Осуществлять контроль по применению расценок при оформлении акта по форме КС-2.

6.1.7. Осуществлять проверку наличия документации (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и пр.) на используемые строительные материалы, оборудование, изделия и конструкции, а также правильность ведения исполнительной документации (общих и специальных журналов работ) при производстве работ по настоящему Договору.

6.1.8. Участвовать в работе приемочной комиссии по приемке видов, этапов работ, в том числе при освидетельствовании скрытых работ, по благоустройству объекта, по приемке объекта в эксплуатацию с подписанием соответствующих актов и документов.

6.2. Строительный контроль имеет право:

6.2.1. Назначить уполномоченного представителя во взаимоотношениях Сторон по настоящему Договору с обязательным письменным уведомлением соответствующих Сторон об этом.

6.2.1. Запрашивать у Подрядчика документы, необходимые для исполнения своих функций.

6.2.2. Самостоятельно проводить оценку поставляемых на объект материалов, а также выполняемых работ, на соответствие действующим нормативным документам, с применением средств инструментального контроля.

6.2.3. Участвовать совместно с Заказчиком и Подрядчиком в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами по Договору.

7. Права и обязанности Плательщика

7.1. Плательщик обязан:

7.1.1. Заключить с Подрядчиком Соглашение о предоставлении из бюджета Новокузнецкого городского округа субсидии на возмещение затрат, возникших в ходе благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы" (далее - Соглашение), в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

7.1.2. После выполнения работ по благоустройству дворовых территорий по договору подряда в целях получения субсидии Плательщик обязан принять заявление о предоставлении субсидии и, в случае принятия положительного решения, в течение 3 рабочих дней со дня получения от получателя субсидии заявления и приложенных к нему документов направить акты по форме КС-2, справки по форме КС-3 в Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса для проверки.

7.1.3. В случае наличия основания для отказа в предоставлении субсидии Плательщик в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления и приложенных к нему документов направляет Подрядчику соответствующее уведомление с указанием основания для отказа и срока для устранения нарушений.

7.1.4. Оплатить Подрядчику стоимость работ по Договору, перечислив денежные средства на расчетный счет Подрядчика, открытый в кредитной организации, в соответствии с заключенным Соглашением.

7.2. Плательщик имеет право:

7.2.1. Предъявлять претензии и требовать от Подрядчика уплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, возмещения ущерба, причиненного третьим лицам в ходе выполнения работ и (или) в течение гарантийного срока на выполняемые работы.

7.2.2. Предъявлять требование к Подрядчику о возврате полученной стоимости работ по Договору в случае выявления фактов несоответствия выполняемых работ условиям настоящего Договора, в том числе нарушения сроков его выполнения.

8. Приемка выполненных работ

8.1. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней письменно уведомить представителей Заказчика, Строительного контроля, членов приемочной комиссии о завершении работ по Договору и готовности объекта, выполненных работ к сдаче и представить представителю Заказчика счет-фактуру, акт приемки объекта в эксплуатацию, акт по форме КС-2, справку по форме КС-3 и иные документы в соответствии с пунктом 2.3 Договора.

8.2. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует в установленном порядке и осуществляет приемку объекта в эксплуатацию приемочной комиссией.

8.3. Состав приемочной комиссии утверждается Заказчиком. В состав комиссии включаются в том числе представители собственников помещений многоквартирного дома и члены общественной комиссии.

8.4. При обнаружении приемочной комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков составляется акт, в котором фиксируются перечень дефектов и сроки их устранения.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. При возникновении между Заказчиком и/или Строительным контролем и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

8.6. При производстве скрытых работ сторонами составляется Акт

освидетельствования скрытых работ. Подрядчик письменно извещает Заказчика и Строительный контроль за 2 (два) рабочих дня до начала приемки о готовности скрытых работ к сдаче. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком и Строительным контролем скрытых работ и подписания Акта освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено Подрядчиком без надлежащего уведомления Заказчика и Строительного контроля, то по требованию последних Подрядчик обязан за свой счет вскрыть закрытые без их освидетельствования скрытые работы, а затем восстановить их за свой счет.

8.7. В течение 2-х дней после устранения всех замечаний, выявленных приемочной комиссией, выполненные работы принимаются членами приемочной комиссии путем подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию (приложение № 3 к настоящему Договору).

8.8. При отсутствии замечаний к выполненным работам Заказчиком Подрядчиком и Строительным контролем подписываются акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3.

8.9. Объект считается принятым в эксплуатацию и обязательства Подрядчика считаются надлежащим образом исполненными со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, акта по форме КС-3.

8.10. С момента подписания Заказчиком акта по форме КС-2 заказчик принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

8.11. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации и иного использования результата работы.

9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком, и используемые материалы.

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы по Договору должен быть не менее трех лет, определяется исходя из результатов отбора подрядных организаций и составляет: **50 месяцев** со дня подписания акта по форме КС-2, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или неправильной его эксплуатации.

9.3. При обнаружении дефектов в пределах гарантийного срока Заказчик, Строительный контроль должны письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 (трех) дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно.

Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов; все расходы по оплате услуг, в случае установления наступления гарантийного случая, несет Подрядчик.

10. Ответственность Сторон

10.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение условий исполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик несет ответственность в виде штрафа, который определяется в процентном соотношении от стоимости работ, указанной в пункте 2.1 Договора. Размер штрафа определяется в следующем порядке:

1) за нарушение сроков начала выполнения работ - 0,2 (ноль целых две десятых) процента за каждый день просрочки до начала выполнения работ;

2) за нарушение сроков окончания работ - 0,3 (ноль целых три десятых) процента за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

3) за нарушение условий, предусмотренных пунктом 5.1.18 Договора, - 0,1 (ноль целых одна десятая) процента за каждый день перерыва в работе;

4) в случае иного нарушения своих обязательств - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента;

5) за допущенные отступления от требований, предусмотренных дизайн-проектом благоустройства дворовой территории и сметной документации - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента.

10.3. Уплата штрафа и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождают Подрядчика от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.4. Заказчик не несет ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Плательщиком своих обязательств по оплате выполненных работ Подрядчиком.

10.5. Указанные в настоящем разделе штрафы взимаются Заказчиком или Плательщиком по согласованию с Заказчиком за каждое нарушение в отдельности.

10.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение указанного обязательства произошло вследствие

непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.7. В случае штрафов Подрядчиком в добровольном порядке за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе взыскать штрафы в судебном порядке.

10.8. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по настоящему Договору, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

11.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1 настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местного самоуправления.

11.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие настоящего Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

12. Порядок изменения, расторжения Договора

12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

12.2. В случае смены заказчика на основании принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, общим собранием членов товарищества собственников жилья, общим собранием членов кооператива решения в зависимости от способа управления права и обязанности заказчика по договору подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой(ых) территории(й) многоквартирного(ых) дома(ов), включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы", возникают у вновь выбранной организации в

соответствии с требованиями норм жилищного законодательства РФ путем подписания сторонами Договора дополнительного соглашения по форме согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

13. Разрешение споров

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора и в течение гарантийного срока на выполненные работы по ремонту объекта, разрешаются по взаимному согласию и регулируются путем переговоров.

13.2. Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. Оформленная надлежащим образом претензия должна быть направлена по почте с уведомлением и описью вложения или вручена под расписку. Претензия подлежит рассмотрению в течение 10 дней с момента ее получения.

13.3. Досудебный порядок урегулирования споров является обязательным условием при рассмотрении возникших между Сторонами споров.

13.4. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Кемеровской области в установленном порядке.

14. Прочие условия

14.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами по настоящему Договору.

14.2. Стороны установили, что уступка права требования по настоящему договору не допускается.

14.3. Договор составлен в 4-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр - для Заказчика, второй - для Подрядчика, третий - для Строительного контроля, 4 - для Плательщика.

14.4. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

14.5. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

14.6. В решении иных вопросов, не оговоренных в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15. Приложения к настоящему Договору

15.1. Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

1) график выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (приложение № 1);

2) акт приемки объекта в эксплуатацию (приложение № 3);

3) дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома (приложение № 4);

4) локальные сметные расчеты стоимости работ (приложение № 5).

16. Местонахождение и реквизиты Сторон

16.1. Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Престиж НК» (ООО «УК Престиж НК»)
Юридический:
РФ, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Шункова, д. 18-86
Почтовый адрес:
РФ, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Технический, д. 33/2, оф. 202
ИНН 4253028269 КПП 425301004 ОГРН 1154253002090
Реквизиты заказчика:
Тел. 79-87-79; эл. почта: prestige.nk@yandex.ru
Банковские реквизиты:
АО АБ «КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК»
Расчетный счет 40702810000000007338
к/с 30101810600000000740 БИК 043209740
16.2. Подрядчик: ООО «НК-Стройпродукт»
Юридический адрес: 654034, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, 59Б
Почтовый адрес: 654034, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, 59Б
Фактический адрес: 654034, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, 59Б
Реквизиты подрядчика:
Тел. 8 951 595 3152; эл. почта: zarudneva.n@mail.ru
ИНН 4217157597 КПП 425301001 ОГРН 1134217008100
Банковские реквизиты:
Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск
р/с. 40702810404000043488
к/с 30101810500000000816
БИК 045004816
16.3. Строительный контроль:
Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция ЖКХ» города Новокузнецка (МБУ «Дирекция ЖКХ»)

Юридический (почтовый, фактический) адрес:
654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 8Б
Телефон/факс: (3843) 71-19-67, e-mail: deznk@mail.ru
ИНН 4217066533, КПП 421701001, ОГРН 1044217014544
Банковские реквизиты:
Финансовое управление г. Новокузнецка (МБУ "Дирекция ЖКХ" г. Новокузнецка
л/сч 20396001090)
Расчетный счет 03234643327310003901
Кор. счет 40102810745370000032
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области – Кузбассу г Кемерово
БИК 013207212

16.4 Плательщик: Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка (Комитет ЖКХ)
Юридический (почтовый, фактический) адрес:
654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 8Б
Телефон/факс: (3843)71-19-66, e-mail: info@gkh-nk.ru
ИНН 4217131091, КПП 421701001, ОГРН 1114217000413
Банковские реквизиты:
Плательщик: Финансовое управление г. Новокузнецка (Комитет ЖКХ г. Новокузнецка л/с 03393005900)
Банк плательщика: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области - Кузбассу г Кемерово
Кор. счет. 40102810745370000032
Расчетный счет 03231643327310003901
БИК 013207212

17. Подписи Сторон

Заказчик:

_____ /Каширина С.С./
"20" октября 2022г.
МП

Подрядчик:

_____ /Заруднева, Н.А./
" " _____ 2022г.
МП

Строительный контроль:

_____ /Криулькин С.В./
" " _____ 2022г.
МП

Плательщик:

_____ /Либер М.В./
" " _____ 2022г.
МП

Приложение № 1
к договору подряда на выполнение работ
по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома, включенных
в муниципальную программу "Формирование
современной городской среды на территории
Новокузнецкого городского округа
на 2018 - 2024 годы"
от 20.10.2022 № 8/3-2023

График
выполнения работ по благоустройству дворовой(ых)
территории(й) многоквартирного(ых) дома(ов)

№ п/п	Вид работ	Срок выполнения
г. Новокузнецк, ул. Ленина, 15		
1	Валка деревьев; Корчевка пней	01.05.2023 – 05.05.2023
2	Засыпка ям подкоренных щебнем	06.05.2023 – 07.05.2023
3	Разборка бордюрного камня	08.05.2023 – 20.05.2023
4	Разборка а/б покрытия	21.05.2023 - 31.05.2023
5	Разработка грунта	01.06.2023 -07.06.2023
6	Устройство песчаного основания; Прокладка асбестоцементной трубы	08.06.2023 – 11.06.2023
7	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня под бордюры	12.06.2023 – 24.06.2023
8	Установка бордюрного камня	25.06.2023 – 10.07.2023
9	Устройство основания из шлакового щебня	11.07.2023 – 22.07.2023
10	Устройство покрытия а/бетона, розлив битума	23.07.2023 – 27.07.2023
11	Установка урны, скамьи	28.07.2023 – 29.07.2023

Заказчик:
_____ /Каширина С.С./
"20" октября 2022г.
МП

Подрядчик:
_____ /Заруднева, Н.А./
"___" _____ 2022г.
МП

Строительный контроль:
_____ /Криулькин С.В./
"___" _____ 2022г.
МП

Плательщик:
_____ /Пономарева Л.В./
"___" _____ 2022г.
МП

Общество с ограниченной ответственностью

«НК-Стройпродукт»

Россия, 654034, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Толмачева, 59Б
ИНН/КПП 4217157597/425301001, ОГРН 1134217008100 р/с 40702810404000043488 в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск к/с 30101810500000000816 БИК 045004816

Приложение № 2
к договору подряда на выполнение работ
по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома, включенных
в муниципальную программу "Формирование
современной городской среды на территории
Новокузнецкого городского округа
на 2018 - 2024 годы"
от 20.10.2022 № 8/3-2023

График выхода бригад

№ п/п	Адрес объекта	Состав бригады		Период работы (дата, время работы)
		должность	Ф.И.О.	
1	**г. Новокузнецк, ул. Ленина, 15**	Бригадир	Наргизян П. А.	01.05.2023-29.07.2023
2		Мастер	Кочарян А.С.	01.05.2023-29.07.2023
3		Асфальтобетонщик	Багдасарян Х.М.	01.05.2023-29.07.2023
4		Дорожник	Хачоян Г.М.	01.05.2023-29.07.2023
5		Асфальтобетонщик	Хачоян А.М.	01.05.2023-29.07.2023

Заказчик:

_____ /Каширина С.С./
"20" октября 2022г.
МП

Подрядчик:

_____ /Заруднева, Н.А./
" ___ _____ 2022г.
МП

Строительный контроль:

_____ /Криулькин С.В./
" ___ _____ 2022г.
МП

Плательщик:

_____ /Либер М.В./
" ___ _____ 2022г.
МП

Приложение №4 к договору №13-2023 от 20.10.2022

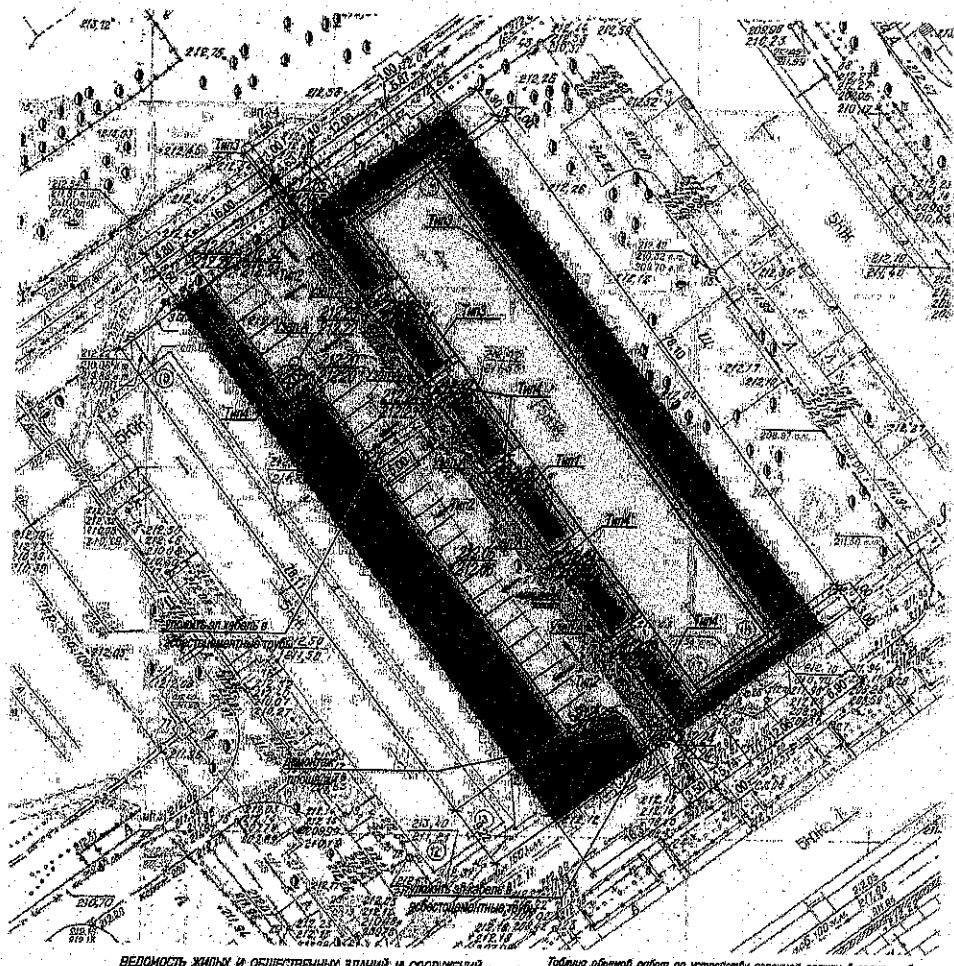

ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер на плане	Наименование	Примечание
1	Многоквартирный жилой дом	существующий

Таблица объемов работ по устройству дорожной одежды в границах благоустройства

№	Наименование	Тип	Условное обозначение	Количество
1	Конструкция дорожной одежды проездов (восстанавливаемое) м2	1		172,8
2	Конструкция дорожной одежды проезда парковки (проектируемое) м2 – брусчатка	2		787,2
3	Конструкция дорожной одежды (восстанавливаемое) м2 – отмостки	3		172,5
	– тротуара, код площадки	3		23,0
4	Конструкция дорожной одежды тротуара (проектируемое) м2	4		143,9

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

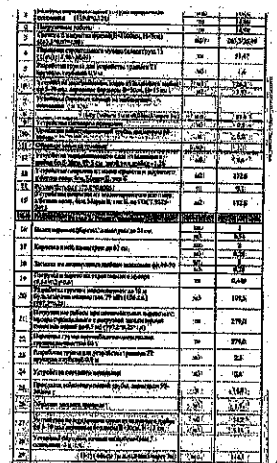

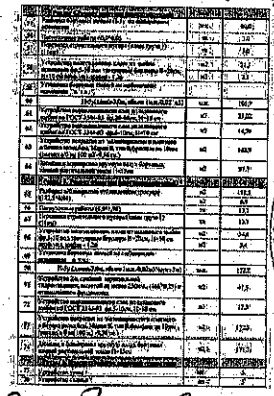

Согласовано: Подрядчик
Директор ООО "НК-Строй-продукт"
Зарудцева Н.А.

РОССИЯ Кемеровская область г.Новокузнецк
Общество с ограниченной ответственностью «НК-Стройпродукт»
ОГРН 1134217008100
ИНН 4217157597

Утверждаю: Заказчик
Директор ООО УК "Престиж-НК"
Каширина С.С.

Общество с ограниченной ответственностью «УК Престиж-НК» г. Новокузнецк Кемеровская область
ОГРН 1154253005000

ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ПРОЕЗДА (ТИП 1). М 1:20
восстановление проезда

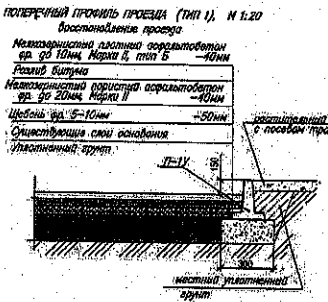

ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ПРОЕЗДА (ТИП 2). М 1:20
проектируемый проезд без подземных коммуникаций

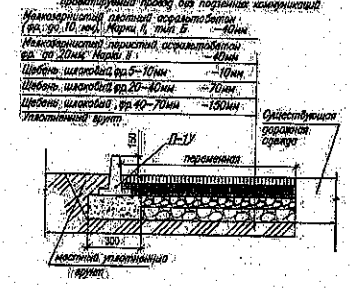

СЕЧЕНИЕ ОТМОСТКИ/ТРОТУАРА (ТИП 3). М 1:20
восстановление отмостки/тротуара, код площ

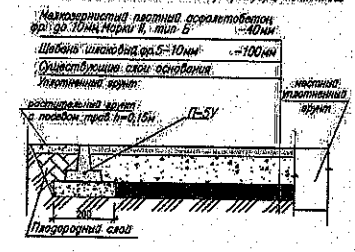

ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ТРОТУАРА (ТИП 4). М 1:20
проектируемый тротуар

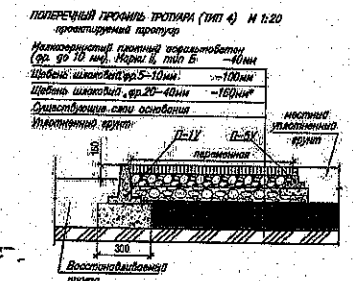

* – предусмотреть толщину выравнивающего слоя по месту до проектируемых отметок

Закрепление бортовых камней П–1У



Закрепление бортовых камней П–5У





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Многоквартирный жилой дом
- Восстановление существующего тротуара
- Озеленение проектируемое
- Озеленение существующее
- Восстановление дорожного покрытия
- Проектируемый тротуар
- Проектируемая парковка
- — узел "А"
- 244.06 – абсолютная отметка проектируемая
- 244.24 – абсолютная отметка существующая
- бортовой камень П–1У (0,046м3/через 3м), L=201,5п.м.
- бортовой камень П–5У (0,02м3/через 3м), L=295,1п.м
- – направление водоотвода
- – выкорчевка деревьев

Укладка кабеля в а/ц трубы



Узел "А"



ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Выполнить подъем тротуаров и площадок перед подъездом с перепадом высот с проезжей частью 0,15 м. Уклон осуществить в направлении проезжей части и озеленения. По месту предусмотреть перепад высот между крыльцом и площадкой не менее 0,05 м.
2. Выполнить уклон проезжей части в поперечном направлении в сторону сбора на озеленение.
Предусмотреть по месту разрывы между бортовыми камнями в пониженных точках проезда.
В месте где предусмотрено наращивание вертовой колодца до планировочных отметок выполнить
согласно письму от ООО "Водоканал" от 19.07.2021г

						ЦГ–1347/Х–15			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г.Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Ленина, д.15			
Разработал		Нижникова					Стадия	Лист	Листов
Проверил		Морева					П	1	1
Н.контроль		Донская				Разбивочный план. Благоустройство и озеленение. М 1:500	ООО "ЦПИЗ" г.Новокузнецк пр.Строителей, 52		
ГИП		Донская							

<50-1*50-1*2>

Приложение №5
к договору подряда №8/3-2023 от 20.10.2022г.

СОГЛАСОВАНО:
Смета на сумму: 4 042 282,86 руб.
Подрядчик: Директор ООО "НК-Стройпродукт"
_____/Заруднева Н.А./
"____"_____2022г.
мп

СОГЛАСОВАНО:
Смета на сумму: 4 042 282,86 руб.
Директор МБУ "Дирекция ЖКХ"
_____/Криулькин С.В.
"____"_____2022г.
мп

СОГЛАСОВАНО:
Смета на сумму: 4 042 282,86 руб.
Председатель Комитета ЖКХ
_____/Либер М.В./
"____"_____2022г.
мп

УТВЕРЖДАЮ:
Смета на сумму: 4 042 282,86 руб.
Заказчик: Директор ООО УК "Престиж-НК"
_____/Каширина С.С./
"____"_____2022г.
мп

Наименование редакции сметных нормативов ТСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)
Наименование программного продукта ПК РИК (вер. 1.3.220225)

Благоустройсво 2023
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 2
Благоустройство дворовой территории по адресу: ул.Ленина 15 (минимальный перечень)
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв-л.2022 с учетом индекса-дефлятора (01.01.2000)

Сметная стоимость 4 042,282 (289,336) тыс. руб.
в том числе
строительных работ 3 131,338 (266,270) тыс. руб.
монтажных работ 0,000 (0,000) тыс. руб.
оборудования 0,000 (0,000) тыс. руб.
прочих затрат 0,000 (0,000) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 101,692 (8,647) тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих 842,21 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов 143,35 чел.-ч.
Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен
				на единицу	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		

Раздел 1. Дорожное хозяйство							
	Ремонт дворовых проездов Тип 1 S=172,8м2						
1	ТЕРр 68-14-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании П1у	100 м	1,198	1,198		
		1 ОТ				525,77	629,87
		3 ЭМ				482,88	578,49
		2 в т. ч. ОТм				77,31	92,62
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	52,63	63,05		
		ЗТм	чел.-ч	6,40	7,67		
		Итого по расценке				1 008,65	1 208,36
1.1	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор Объём: (1.198)*((119.8*0.125)/1.198)	т	12,5	14,98		
		ФОТ					722,49
	Пр/812-102.0-1	НР	%	102	102		736,94
	Пр/774-102.0	СП	%	54	54		390,14
		Всего по позиции					2 335,44
2	ТЕРр 68-12-8	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм	1000 м2 покрытия	0,2633	0,2633		
		1 ОТ				92,48	24,35
		3 ЭМ				11 431,43	3 009,90
		2 в т. ч. ОТм				249,25	65,63
		4 М					
	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона	т	138,6	36,49338		
		ЗТ	чел.-ч	9,87	2,60		
		ЗТм	чел.-ч	15,51	4,08		
		Итого по расценке				11 523,91	3 034,25
2.1	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона Объём: (0.2633)*138.6	т	138,6	36,49		
		ФОТ					89,98
	Пр/812-102.0-1	НР	%	102	102		91,78
	Пр/774-102.0	СП	%	54	54		48,59
		Всего по позиции					3 174,62
3	ТССЦпг 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	14,98	14,98		
		1 ОТ					
		3 ЭМ				3,87	57,97

		2 в т. ч. ОТм				0,39	5,84
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч				
		ЗТм	чел.-ч	0,02	0,36		
		Итого по расценке					
		ФОТ				4,49	67,31
		НР	%	100	100		5,84
		СП	%	60	60		5,84
		Всего по позиции					3,50
4	ТССЦпг 03-21-01-011	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км	1 т груза	51,47	51,47	13,55	67,31 697,42
		Объём: 14.98+36.49					
		Всего по позиции					697,42
5	ТЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,016	0,016		
		1 ОТ				1 442,98	23,09
		3 ЭМ					
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	154,00	2,46		
		ЗТм	чел.-ч				
		Итого по расценке					
		ФОТ				1 442,98	23,09
	Пр/812-001.2-1	НР	%	89	89		23,09
	Пр/774-001.2	СП	%	40	40		20,55
		Всего по позиции					9,24
6	ТЕР 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0,05	0,05		52,88
		1 ОТ				100,16	5,01
		3 ЭМ				29,87	1,49
		2 в т. ч. ОТм				4,23	0,21
		4 М				1 480,27	74,01
		ЗТ	чел.-ч	10,20	0,51		
		ЗТм	чел.-ч	0,35	0,02		
		Итого по расценке					
		ФОТ				1 610,30	80,51
	Пр/812-018.0-1	НР	%	117	117		5,22
	Пр/774-018.0	СП	%	74	74		6,11
		Всего по позиции					3,86
							90,48

7	ТЕР 34-02-001-03 прим.	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий	1 канало-километр трубопровода	0,006	0,006		
		Объём: 6.0/1000					
		1 ОТ				1 463,04	8,78
		3 ЭМ					
		2 в т. ч. ОТм				14 122,15	84,73
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	144,00	0,86		
		ЗТм	чел.-ч				
		Итого по расценке					
		ФОТ				15 585,19	93,51
	Пр/812-028.0-1	НР	%	98	98		8,78
	Пр/774-028.0	СП	%	58	58		8,60
		Всего по позиции					5,09
8	ТЕР 01-01-033-04	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1(щебнем шлаковым)	1000 м3 грунта	0,0011	0,0011		107,20
		1 ОТ					
		3 ЭМ				443,73	0,49
		2 в т. ч. ОТм				56,74	0,06
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч				
		ЗТм	чел.-ч	3,50			
		Итого по расценке					
		ФОТ				443,73	0,49
	Пр/812-001.1-1	НР	%	92	92		0,06
	Пр/774-001.1	СП	%	46	46		0,06
		Всего по позиции					0,03
9	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 5-20мм (под дорожные бордюры: фр. 5-20мм В=30см, Н=15см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0393	0,0393		0,58
		Объём: 87.4*0.3*0.15					
		1 ОТ				121,95	4,79
		3 ЭМ				4 465,64	175,50
		2 в т. ч. ОТм				478,22	18,79
		4 М				29,50	1,16

	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный	м3	П	П		
		ЗТ	чел.-ч	12,77	0,50		
		ЗТм	чел.-ч	29,74	1,17		
		Итого по расценке				4 617,09	181,45
9.1	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный	м3				
		Объём: (0.0393)*0.0					
9.2	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27,2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	126	4,95	111,89	553,86
		Объём: (0.0393)*126.0					
		ФОТ					23,58
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	147		34,66
	Пр/774-021.0	СП	%	95	95		22,40
		Всего по позиции					792,37
10	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (П-1у)	100 м бортового камня	0,874	0,874		
		1 ОТ				772,97	675,58
		3 ЭМ				104,20	91,07
		2 в т. ч. ОТм				11,02	9,63
		4 М				3 677,44	3 214,08
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100	87,4		
		ЗТ	чел.-ч	76,08	66,49		
		ЗТм	чел.-ч	0,68	0,59		
		Итого по расценке				4 554,61	3 980,73
10.1	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001	-0,000874	10 557,18	-9,23
		Объём: (0.874)*(-0.001)					
10.2	ТССЦ 102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,14858	705,14	-104,77
		Объём: (0.874)*(-0.17)					
10.3	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100	87,4		
		Объём: (0.874)*100					
10.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-5,157	594,11	-3 063,83
		Объём: (0.874)*-5.9					
10.5	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1,564	1,367	594,11	812,15
		Объём: (0.874)*((87.4/3*0.046*1.02)/0.874)					

10.6	ТССЦ 403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (по типу П1у V=0,16/3=0,0533 м3/1мп)	м3	5,33	4,658	2 012,95	9 376,32
		Объём: (0.874)*((87.4*0.0533)/0.874)					
		ФОТ					685,21
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	147		1 007,26
	Пр/774-021.0	СП	%	95	95		650,95
		Всего по позиции					12 649,58
11	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,0372	-0,0372		
		Объём: -(5.157/1.02-(87.4/3.0*0.046))					
		1 ОТ				1 686,60	-62,74
		3 ЭМ				2 609,79	-97,08
		2 в т. ч. ОТм				291,78	-10,85
		4 М				2 412,90	-89,76
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	-3,7944		
		ЗТ	чел.-ч	180,00	-6,70		
		ЗТм	чел.-ч	18,00	-0,67		
		Итого по расценке				6 709,29	-249,58
11.1	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	-0,200	0,0074315	1,98	0,01
		Объём: (-0.03715749)*(-0.2)					
11.2	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-249,714	9,2893725	9,65	89,64
		Объём: (-0.03715749)*(-250.0)					
11.3	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	-3,7944		
		Объём: (-0.0372)*102					
		ФОТ					-73,59
	Пр/812-006.0-1	НР	%	102	102		-75,06
	Пр/774-006.0	СП	%	58	58		-42,68
		Всего по позиции					-277,67
12	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 5-10мм (толщ.5см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,086	0,086		
		Объём: 172.8*0.05					
		1 ОТ				121,95	10,49
		3 ЭМ				4 465,64	384,05
		2 в т. ч. ОТм				478,22	41,13
		4 М				29,50	2,54

	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный	м3	П	П		
		ЗТ	чел.-ч	12,77	1,10		
		ЗТм	чел.-ч	29,74	2,56		
		Итого по расценке					
12.1	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27,2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	126	10,84	4 617,09	397,08
		Объём: (0.086)*126.0				111,89	1 212,89
		ФОТ					
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	147		51,62
	Пр/774-021.0	СП	%	95	95		75,88
		Всего по позиции					49,04
13	ТЕР 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,1728	0,1728		1 734,89
		1 ОТ				442,75	76,51
		3 ЭМ				2 777,78	480,00
		2 в т. ч. ОТм				315,72	54,56
		4 М				369,04	63,77
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	93,7	16,19136		
		ЗТ	чел.-ч	38,30	6,62		
		ЗТм	чел.-ч	19,10	3,30		
		Итого по расценке					
13.1	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	93,7	16,191	3 589,57	620,28
		Объём: (0.1728)*93.7					
13.2	ТССЦ 410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	93,7	16,191	518,60	8 396,65
		Объём: (0.1728)*93.7					
		ФОТ					
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	147		131,07
	Пр/774-021.0	СП	%	95	95		192,67
		Всего по позиции					124,52
14	ТЕР 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,09	0,09		9 334,12
		Объём: 172.8*0.0005					

		1 ОТ					
		3 ЭМ				49,08	4,42
		2 в т. ч. ОТм				8,59	0,77
		4 М				1 932,69	173,94
		ЗТ	чел.-ч				
		ЗТм	чел.-ч	0,66	0,06		
		Итого по расценке					
		ФОТ				1 981,77	178,36
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	147		0,77
	Пр/774-021.0	СП	%	95	95		1,13
		Всего по позиции					0,73
15	ТЕР 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,1728	0,1728		180,22
		1 ОТ				442,75	76,51
		3 ЭМ				2 769,94	478,65
		2 в т. ч. ОТм				315,39	54,50
		4 М				225,21	38,92
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	96,6	16,69248		
		ЗТ	чел.-ч	38,30	6,62		
		ЗТм	чел.-ч	19,08	3,30		
		Итого по расценке					
15.1	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная Объём: (0.1728)*96.6	т	96,6	16,69	3 437,90	594,08
15.2	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	96,6	16,69	570,70	9 524,98
		Объём: (0.1728)*96.6					
		ФОТ					131,01
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	147		192,58
	Пр/774-021.0	СП	%	95	95		124,46
		Всего по позиции					10 436,10
	Ремонт автомобильных парковок парковок Тип 2 S=787,2м2						
16	ТЕРр 68-3-3	Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм(D=24 см V=0.47м3 ствол, +15% на ветви 0,07м3)	1 складочный м3 кряжей	0,54	0,54		

		Объём: 0.47+0.07					
		1 ОТ				29,91	16,15
		3 ЭМ				13,95	7,53
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	2,97	1,60		
		ЗТм	чел.-ч				
		Итого по расценке				43,86	23,68
		ФОТ					16,15
	Пр/812-102.0-1	НР	%	102	102		16,47
	Пр/774-102.0	СП	%	54	54		8,72
		Всего по позиции					48,87
17	ТЕР 01-02-105-02	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см (V пня=0,1м3*2шт=0,2м3)	100 пней	0,02	0,02		
		1 ОТ				670,64	13,41
		3 ЭМ				71,62	1,43
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	4,14	0,08		
		ЗТм	чел.-ч				
		Итого по расценке				670,64	13,41
		ФОТ					1,43
	Пр/812-001.4-1	НР	%	89	89		1,27
	Пр/774-001.4	СП	%	41	41		0,59
		Всего по позиции					15,27
18	ТЕР 01-02-107-01	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) (под проезжей частью)	100 ям	0,02	0,02		
		1 ОТ				295,40	5,91
		3 ЭМ				37,77	0,76
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	2,33	0,05		
		ЗТм	чел.-ч				
		Итого по расценке				295,40	5,91
18.1	ТССЦ 409-0082	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000	м3	10	0,2	94,86	18,97

		Объём: (0.02)*(0.2/0.02)					
		ФОТ					
	Пр/812-001.4-1	НР	%	89	89		0,76
	Пр/774-001.4	СП	%	41	41		0,68
		Всего по позиции					0,31
19	ТССЦпг 01-01-01-007	Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого	1 т груза	0,329	0,329		25,87
		Объём: 0.54*0.61					
		1 ОТ				2,55	0,84
		3 ЭМ				8,78	2,89
		2 в т. ч. ОТм				0,86	0,28
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	0,25	0,08		
		ЗТм	чел.-ч	0,06	0,02		
		Итого по расценке				16,79	5,52
		ФОТ					1,12
		НР	%	100	100		1,12
		СП	%	60	60		0,67
		Всего по позиции					5,52
20	ТССЦпг 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	0,12	0,12		
		Объём: 0.2*0.61					
		1 ОТ				3,87	0,46
		3 ЭМ				0,39	0,05
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч				
		ЗТм	чел.-ч	0,02			
		Итого по расценке				4,49	0,54
		ФОТ					0,05
		НР	%	100	100		0,05
		СП	%	60	60		0,03
		Всего по позиции					0,54
21	ТССЦпг 03-21-01-011	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км	1 т груза	0,449	0,449	13,55	6,08
		Объём: 0.329+0.12					
		Всего по позиции					6,08

22	ТЕР 01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,1993	0,1993		
		Объём: (787.2+10)*0.25					
		1 ОТ				949,58	189,25
		3 ЭМ				121,41	24,20
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч				
		ЗТм	чел.-ч	7,49	1,49		
		Итого по расценке					
		ФОТ				949,58	189,25
	Пр/812-001.1-1	НР	%	92	92		24,20
	Пр/774-001.1	СП	%	46	46		22,26
		Всего по позиции					11,13
23	ТССЦпг 01-01-01-039 ОП ТЕР01прил.1п.9в	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	279,02	279,02		222,64
		Объём: 797.2*0.25*1.4					
		1 ОТ				4,67	1 303,02
		3 ЭМ				0,47	131,14
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч				
		ЗТм	чел.-ч	0,03	8,09		
		Итого по расценке					
		ФОТ				5,42	1 512,84
		НР	%	100	100		131,14
		СП	%	60	60		131,14
		Всего по позиции					78,68
24	ТССЦпг 03-21-01-011	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км	1 т груза	279,02	279,02	13,55	1 512,84 3 780,72
		Всего по позиции					3 780,72
25	ТЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,025	0,025		
		1 ОТ				1 442,98	36,07
		3 ЭМ					

		2 в т. ч. ОТм					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	154,00	3,85		
		ЗТм	чел.-ч				
		Итого по расценке					
		ФОТ				1 442,98	36,07
	Пр/812-001.2-1	НР	%	89	89		36,07
	Пр/774-001.2	СП	%	40	40		32,10
		Всего по позиции					14,43
26	ТЕР 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0,08	0,08		82,60
		1 ОТ				100,16	8,01
		3 ЭМ				29,87	2,39
		2 в т. ч. ОТм				4,23	0,34
		4 М				1 480,27	118,42
		ЗТ	чел.-ч	10,20	0,82		
		ЗТм	чел.-ч	0,35	0,03		
		Итого по расценке					
		ФОТ				1 610,30	128,82
	Пр/812-018.0-1	НР	%	117	117		8,35
	Пр/774-018.0	СП	%	74	74		9,77
		Всего по позиции					6,18
27	ТЕР 34-02-001-03 прим.	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий	1 канало-километр трубопровода	0,014	0,014		144,77
		Объём: 14.0/1000					
		1 ОТ				1 463,04	20,48
		3 ЭМ					
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М				14 122,15	197,71
		ЗТ	чел.-ч	144,00	2,02		
		ЗТм	чел.-ч				
		Итого по расценке					
		ФОТ				15 585,19	218,19
	Пр/812-028.0-1	НР	%	98	98		20,48
	Пр/774-028.0	СП	%	58	58		20,07
		Всего по позиции					11,88
28	ТЕР 01-01-033-04	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1(щебнем шлаковым)	1000 м3 грунта	0,0017	0,0017		250,14
		1 ОТ					

		3 ЭМ				443,73	0,75
		2 в т. ч. ОТм				56,74	0,10
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч				
		ЗТм	чел.-ч	3,50	0,01		
		Итого по расценке					
		ФОТ				443,73	0,75
	Пр/812-001.1-1	НР	%	92	92		0,10
	Пр/774-001.1	СП	%	46	46		0,09
		Всего по позиции					0,05
29	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 5-10мм (под дорожные бордюры: фр. 5-20мм В=30см, Н=15см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0513	0,0513		0,89
		Объём: 114.1*0.3*0.15					
		1 ОТ				121,95	6,26
		3 ЭМ				4 465,64	229,09
		2 в т. ч. ОТм				478,22	24,53
		4 М				29,50	1,51
	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный	м3	П	П		
		ЗТ	чел.-ч	12,77	0,66		
		ЗТм	чел.-ч	29,74	1,53		
		Итого по расценке					
29.1	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27,2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	126	6,46	4 617,09	236,86
		Объём: (0.0513)*126.0				111,89	722,81
		ФОТ					
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	147		30,79
	Пр/774-021.0	СП	%	95	95		45,26
		Всего по позиции					29,25
30	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (П-1у)	100 м бортового камня	1,141	1,141		1 034,18
		1 ОТ				772,97	881,96
		3 ЭМ				104,20	118,89
		2 в т. ч. ОТм				11,02	12,57
		4 М				3 677,44	4 195,96
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100	114,1		
		ЗТ	чел.-ч	76,08	86,81		

		ЗТм	чел.-ч	0,68	0,78		
		Итого по расценке				4 554,61	5 196,81
30.1	ТССЦ 102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,19397	705,14	-136,78
		Объём: (1.141)*(-0.17)					
30.2	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001	-0,001141	10 557,18	-12,05
		Объём: (1.141)*(-0.001)					
30.3	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-6,73	594,11	-3 998,36
		Объём: (1.141)*-5.9					
30.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1,564	1,785	594,11	1 060,49
		Объём: (1.141)*((114.1/3.0*0.046*1.02)/1.141)					
30.5	ТССЦ 403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (по типу П1у V=0,16/3=0,0533 м3/1мп)	м3	5,33	6,082	2 012,95	12 242,76
		Объём: (1.141)*(((1.141)*5.33)/1.141)					
		ФОТ					894,53
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	147		1 314,96
	Пр/774-021.0	СП	%	95	95		849,80
		Всего по позиции					16 517,63
31	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,0485	-0,0485		
		Объём: -(6.73/1.02-(114.1/3.0*0.046))					
		1 ОТ				1 686,60	-81,80
		3 ЭМ				2 609,79	-126,57
		2 в т. ч. ОТм				291,78	-14,15
		4 М				2 412,90	-117,03
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	-4,947		
		ЗТ	чел.-ч	180,00	-8,73		
		ЗТм	чел.-ч	18,00	-0,87		
		Итого по расценке				6 709,29	-325,40
31.1	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	-0,200	0,009697	1,98	0,02
		Объём: (-0.048485058)*(-0.2)					
31.2	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-249,923	12,1212645	9,65	116,97
		Объём: (-0.048485058)*(-250.0)					
		ФОТ					-95,95

	Пр/812-006.0-1	НР	%	102	102		-97,87
	Пр/774-006.0	СП	%	58	58		-55,65
		Всего по позиции					-361,93
32	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 40-70мм (толщ.15см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,181	1,181		
		Объём: 787.2*0.15					
		1 ОТ				121,95	144,02
		3 ЭМ				4 465,64	5 273,92
		2 в т. ч. ОТм				478,22	564,78
		4 М				29,50	34,84
	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный	м3	П	П		
		ЗТ	чел.-ч	12,77	15,08		
		ЗТм	чел.-ч	29,74	35,12		
		Итого по расценке				4 617,09	5 452,78
32.1	ТССЦ 409-0082 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27,2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000	м3	126	148,81	94,86	14 116,12
		Объём: (1.181)*126.0					
		ФОТ					708,80
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	147		1 041,94
	Пр/774-021.0	СП	%	95	95		673,36
		Всего по позиции					21 284,20
33	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 20-40мм (толщ.7см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,551	0,551		
		Объём: 787.2*0.07					
		1 ОТ				121,95	67,19
		3 ЭМ				4 465,64	2 460,57
		2 в т. ч. ОТм				478,22	263,50
		4 М				29,50	16,25
	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный	м3	П	П		
		ЗТ	чел.-ч	12,77	7,04		
		ЗТм	чел.-ч	29,74	16,39		
		Итого по расценке				4 617,09	2 544,01

33.1	ТССЦ 409-0072 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27,2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000	м3	126	69,43	105,16	7 301,26
		Объём: (0.551)*126.0					
		ФОТ					
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	147		330,69
	Пр/774-021.0	СП	%	95	95		486,11
		Всего по позиции					314,16
34	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного фр 5-10мм (толщ. 1см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0787	0,0787		10 645,54
		Объём: 787.2*0.01					
		1 ОТ				121,95	9,60
		3 ЭМ				4 465,64	351,45
		2 в т. ч. ОТм				478,22	37,64
		4 М				29,50	2,32
	ТССЦ 409-9013	Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный	м3	П	П		
		ЗТ	чел.-ч	12,77	1,00		
		ЗТм	чел.-ч	29,74	2,34		
		Итого по расценке					
34.1	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27,2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	126	9,92	4 617,09 111,89	363,37 1 109,95
		Объём: (0.0787)*126.0					
		ФОТ					
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	147		47,24
	Пр/774-021.0	СП	%	95	95		69,44
		Всего по позиции					44,88
35	ТЕР 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-	1000 м2 покрытия	0,7872	0,7872		1 587,64
		1 ОТ				442,75	348,53
		3 ЭМ				2 777,78	2 186,67
		2 в т. ч. ОТм				315,72	248,53
		4 М				369,04	290,51
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	93,7	73,76064		
		ЗТ	чел.-ч	38,30	30,15		
		ЗТм	чел.-ч	19,10	15,04		
		Итого по расценке				3 589,57	2 825,71

35.1	ТССЦ 410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	93,7	73,76	518,60	38 251,94
		Объём: (0.7872)*93.7					
		ФОТ					597,06
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	147		877,68
	Пр/774-021.0	СП	%	95	95		567,21
		Всего по позиции					42 522,54
36	ТЕР 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,39	0,39		
		Объём: 787.2*0.0005					
		1 ОТ				49,08	19,14
		3 ЭМ				8,59	3,35
		2 в т. ч. ОТм				1 932,69	753,75
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч				
		ЗТм	чел.-ч	0,66	0,26		
		Итого по расценке				1 981,77	772,89
		ФОТ					3,35
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	147		4,92
	Пр/774-021.0	СП	%	95	95		3,18
		Всего по позиции					780,99
37	ТЕР 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,7872	0,7872		
		1 ОТ				442,75	348,53
		3 ЭМ				2 769,94	2 180,50
		2 в т. ч. ОТм				315,39	248,28
		4 М				225,21	177,29
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	96,6	76,04352		
		ЗТ	чел.-ч	38,30	30,15		
		ЗТм	чел.-ч	19,08	15,02		
		Итого по расценке				3 437,90	2 706,32

37.1	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	96,6	76,04	570,70	43 396,03
		Объём: (0.7872)*96.6					
		ФОТ					596,81
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	147		877,31
	Пр/774-021.0	СП	%	95	95		566,97
		Всего по позиции					47 546,63
38	ТЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,1445	0,1445		
		Объём: 96.3*0.15					
		1 ОТ				797,39	115,22
		3 ЭМ					
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	88,50	12,79		
		ЗТм	чел.-ч				
		Итого по расценке					
		ФОТ				797,39	115,22
	Пр/812-001.2-1	НР	%	89	89		115,22
	Пр/774-001.2	СП	%	40	40		102,55
		Всего по позиции					46,09
39	ТССЦ 407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	14,45	14,45	111,97	263,86
		Объём: 96.3*0.15					1 617,97
		Всего по позиции					1 617,97
	Ремонт тротуара (восстановленный) Тип 3 S=23м2						
40	ТЕРр 68-14-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основанииП-5у	100 м	0,09	0,09		
		1 ОТ				525,77	47,32
		3 ЭМ				482,88	43,46
		2 в т. ч. ОТм				77,31	6,96
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	52,63	4,74		
		ЗТм	чел.-ч	6,40	0,58		
		Итого по расценке					
40.1	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	5	0,45	1 008,65	90,78
		Объём: (0.09)*((9.0*0.05)/0.09)					
		ФОТ					54,28
	Пр/812-102.0-1	НР	%	102	102		55,37

	Пр/774-102.0	СП	%	54	54		
		Всего по позиции					29,31
41	ТЕРр 68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,013	0,013		175,46
		1 ОТ					
		3 ЭМ				577,02	7,50
		2 в т. ч. ОТм				1 184,57	15,40
		4 М				189,66	2,47
		ЗТ	чел.-ч	57,76	0,75		
		ЗТм	чел.-ч	15,70	0,20		
		Итого по расценке					
41.1	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона	т	79,2	1,03	1 761,59	22,90
		Объём: (0.013)*((13*0.04*1.98)/0.013)					
		ФОТ					9,97
	Пр/812-102.0-1	НР	%	102	102		10,17
	Пр/774-102.0	СП	%	54	54		5,38
		Всего по позиции					38,45
42	ТЕР 27-03-008-05	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,0053	0,0053		
		Объём: 7.5*0.07					
		1 ОТ					
		3 ЭМ				538,03	2,85
		2 в т. ч. ОТм				1 894,11	10,04
		4 М				201,49	1,07
		ЗТ	чел.-ч	57,42	0,30		
		ЗТм	чел.-ч	12,43	0,07		
		Итого по расценке					
		ФОТ				2 432,14	12,89
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	147		3,92
	Пр/774-021.0	СП	%	95	95		5,76
		Всего по позиции					3,72
43	ТССЦпг 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	2,75	2,75		22,37
		Объём: 0.45+1.03+(0.53*2.4)					
		1 ОТ					
		3 ЭМ					
		2 в т. ч. ОТм				3,87	10,64
		4 М				0,39	1,07

		ЗТ	чел.-ч					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,07		
		Итого по расценке					4,49	12,35
		ФОТ						1,07
		НР	%	100		100		1,07
		СП	%	60		60		0,64
		Всего по позиции						12,35
44	ТЕР 01-01-030-06 прим.	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0013		0,0013		
		Объём: 13.0*0.1						
		1 ОТ					949,58	1,23
		3 ЭМ					121,41	0,16
		2 в т. ч. ОТм						
		4 М						
		ЗТ	чел.-ч					
		ЗТм	чел.-ч	7,49		0,01		
		Итого по расценке					949,58	1,23
		ФОТ						0,16
	Пр/812-001.1-1	НР	%	92		92		0,15
	Пр/774-001.1	СП	%	46		46		0,07
		Всего по позиции						1,45
45	ТССЦпг 01-01-01-039 ОП ТЕР01прил.1п.9в	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	1,82		1,82		
		Объём: 13.0*0.1*1.4						
		1 ОТ					4,67	8,50
		3 ЭМ					0,47	0,86
		2 в т. ч. ОТм						
		4 М						
		ЗТ	чел.-ч					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,05		
		Итого по расценке					5,42	9,88
		ФОТ						0,86
		НР	%	100		100		0,86
		СП	%	60		60		0,52
		Всего по позиции						9,88
46	ТССЦпг 03-21-01-011	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км	1 т груза	4,57		4,57	13,55	61,92

		Объём: 2.75+1.82					
		Всего по позиции					61,92
47	ТЕРр 68-37-1	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см	1 колодец	1	1		
		1 ОТ				12,67	12,67
		3 ЭМ				3,69	3,69
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М				48,41	48,41
		ЗТ	чел.-ч	1,29	1,29		
		ЗТм	чел.-ч				
		Итого по расценке				64,77	64,77
47.1	ТССЦ 101-2535	Люки чугунные легкие	шт.	1	1	704,69	704,69
		Объём: (1.0)*1.0					
		ФОТ					12,67
	Пр/812-102.0-1	НР	%	102	102		12,92
	Пр/774-102.0	СП	%	54	54		6,84
		Всего по позиции					789,22
48	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-20мм) (под тротуарные бордюры: фр. 5-20мм В=20см, Н=10см)	100 м2 дорожек и тротуаров	0,0344	0,0344		
		Объём: 17.2*0.2					
		1 ОТ				266,60	9,17
		3 ЭМ				322,22	11,08
		2 в т. ч. ОТм				42,03	1,45
		4 М				4 664,38	160,45
		ЗТ	чел.-ч	26,24	0,90		
		ЗТм	чел.-ч	3,17	0,11		
		Итого по расценке				5 253,20	180,70
48.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4	-0,59856	267,84	-160,32
		Объём: (0.0344)*(-17.4)					
		ФОТ					10,62
	Пр/812-021.1-1	НР	%	113	113		12,00
	Пр/774-021.1	СП	%	77	77		8,18
		Всего по позиции					40,56
49	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01(до толщ. 10 см К=-2)	100 м2 дорожек и тротуаров	0,0344	0,0344		

		Объём: 17.2*0.2						
		1 ОТ			-2		5,49	-0,38
		3 ЭМ			-2		8,53	-0,59
		2 в т. ч. ОТм			-2		1,21	-0,08
		4 М			-2		401,76	-27,64
		ЗТ	0,04 чел.-ч	0,54	-2	-0,04		
		ЗТм	0,01 чел.-ч	0,10	-2	-0,01		
		Итого по расценке					415,78	-28,61
49.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,5	-2	0,1032	267,84	27,64
		Объём: (0.0344)*(-1.5)						
		ФОТ						-0,46
	Пр/812-021.1-1	НР	%	113		113		-0,52
	Пр/774-021.1	СП	%	77		77		-0,35
		Всего по позиции						-1,84
50	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27,2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	0,43		0,43	111,89	48,11
		Объём: 17.2*0.2*0.1*1.26						
		Всего по позиции						48,11
51	ТЕР 27-02-010-02 табл.27.3 п.3.8, бетон К=0,86, раствор К=0,33 к стоимости материалов	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (поребрик П-5у)	100 м бортового камня	0,172		0,172		
		1 ОТ					772,97	132,95
		3 ЭМ					104,20	17,92
		2 в т. ч. ОТм					11,02	1,90
		4 М					3 677,44	632,52
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100		17,2		
		ЗТ	чел.-ч	76,08		13,09		
		ЗТм	чел.-ч	0,68		0,12		
		Итого по расценке					4 554,61	783,39
51.1	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,06		-0,01032	696,05	-7,18
		Объём: (0.172)*-0.06						
51.2	ТССЦ 102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17		-0,02924	705,14	-20,62
		Объём: (0.172)*-0.17						

51.3	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001	-0,000172	10 557,18		-1,82
		Объём: (0.172)*-0.001						
51.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-1,015	594,11		-603,02
		Объём: (0.172)*-5.9						
51.5	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06	0,0103	229,70	0,33	2,37
		Объём: (0.172)*0.06						
51.6	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,68	0,117	510,93	0,86	59,78
		Объём: (0.172)*((17.2/3*0.02*1.02)/0.172)						
51.7	ТССЦ 403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (по типу П5у V= 0,063/3=0,021 м3/1мп)	м3	2,1	0,3612	2 012,95		727,08
		Объём: (0.172)*((17.2*0.021)/0.172)						
		ФОТ						134,85
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	147			198,23
	Пр/774-021.0	СП	%	95	95			128,11
		Всего по позиции						1 266,32
52	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,0088	-0,0088			
		Объём: -(1.015/1.02-(17.2/3*0.02))						
		1 ОТ				1 686,60		-14,84
		3 ЭМ				2 609,79		-22,97
		2 в т. ч. ОТм				291,78		-2,57
		4 М				2 412,90		-21,23
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	-0,8976			
		ЗТ	чел.-ч	180,00	-1,58			
		ЗТм	чел.-ч	18,00	-0,16			
		Итого по расценке						-59,04
52.1	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	-0,200	0,0017609	6 709,29		1,98
		Объём: (-0.008804313)*(-0.2)						
52.2	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-250,123	2,2010783	9,65		21,24
		Объём: (-0.008804313)*(-250.0)						
		ФОТ						-17,41
	Пр/812-006.0-1	НР	%	102	102			-17,76
	Пр/774-006.0	СП	%	58	58			-10,10
		Всего по позиции						-65,66

53	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-10мм)	100 м2 дорожек и тротуаров		0,23		0,23	
		1 ОТ					266,60	61,32
		3 ЭМ					322,22	74,11
		2 в т. ч. ОТм					42,03	9,67
		4 М					4 664,38	1 072,81
		ЗТ	чел.-ч		26,24		6,04	
		ЗТм	чел.-ч		3,17		0,73	
		Итого по расценке					5 253,20	1 208,24
53.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3		-17,4		-4,002	267,84 -1 071,90
		Объём: (0.23)*(-17.4)						
		ФОТ						70,99
	Пр/812-021.1-1	НР	%		113		113	80,22
	Пр/774-021.1	СП	%		77		77	54,66
		Всего по позиции						271,22
54	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01(до толщ. 10 см К=-2)	100 м2 дорожек и тротуаров		0,23		0,23	
		1 ОТ		-2			5,49	-2,53
		3 ЭМ		-2			8,53	-3,92
		2 в т. ч. ОТм		-2			1,21	-0,56
		4 М		-2			401,76	-184,81
		ЗТ	чел.-ч	-2	0,54		-0,25	
		ЗТм	чел.-ч	-2	0,10		-0,05	
		Итого по расценке					415,78	-191,26
54.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-2	-1,5		0,69	267,84 184,81
		Объём: (0.23)*(-1.5)						
		ФОТ						-3,09
	Пр/812-021.1-1	НР	%		113		113	-3,49
	Пр/774-021.1	СП	%		77		77	-2,38
		Всего по позиции						-12,32
55	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27,2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3		2,9		2,9	111,89 324,48
		Объём: 23.0*0.1*1.26						
		Всего по позиции						324,48

56	ТЕР 27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа <VOGELE> малых типоразмеров толщиной слоя 4 см	1000 м2	0,023	0,023		
		1 ОТ				204,94	4,71
		3 ЭМ				4 375,98	100,65
		2 в т. ч. ОТм				126,32	2,91
		4 М				1,82	0,04
	ТССЦ 101-9010	Битум	т	0,65	0,01495		
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	П	П		
		ЗТ	чел.-ч	18,58	0,43		
		ЗТм	чел.-ч	7,98	0,18		
		Итого по расценке					
56.1	ТССЦ 101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,65	0,01495	4 582,74	105,40
		Объём: (0.023)*0.65				1 876,40	28,05
56.2	ТССЦ 410-0006 Прим. норма а/б смеси по ТЕР27-07-001-01 с учетом корректировки толщины по ТЕР27-07-001-02	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	95,6	2,199	570,70	1 254,97
		Объём: (0.023)*((0.23*(7.14+1.21*2))/0.023)					
		ФОТ					
	Пр/812-021.1-1	НР	%	113	113		7,62
	Пр/774-021.1	СП	%	77	77		8,61
		Всего по позиции					5,87
	Ремонт тротуара (проектируемый) Тип 4 S=143,9м2						1 402,90
57	ТЕРр 68-14-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основанииП-5у	100 м	0,6	0,6		
		1 ОТ				525,77	315,46
		3 ЭМ				482,88	289,73
		2 в т. ч. ОТм				77,31	46,39
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	52,63	31,58		
		ЗТм	чел.-ч	6,40	3,84		
		Итого по расценке					
57.1	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	5	3	1 008,65	605,19
		Объём: (0.6)*((60.0*0.05)/0.6)					
		ФОТ					
							361,85

	Пр/812-102.0-1	НР	%	102	102		369,09
	Пр/774-102.0	СП	%	54	54		195,40
		Всего по позиции					1 169,68
58	ТССЦпг 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	3	3		
		1 ОТ				3,87	11,61
		3 ЭМ				0,39	1,17
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч				
		ЗТм	чел.-ч	0,02	0,07		
		Итого по расценке					13,48
		ФОТ				4,49	1,17
		НР	%	100	100		1,17
		СП	%	60	60		0,70
		Всего по позиции					13,48
59	ТССЦпг 03-21-01-011	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км	1 т груза	3	3	13,55	40,65
		Всего по позиции					40,65
60	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-20мм) (под тротуарные бордюры: фр. 5-20мм В=20см, Н=10см)	100 м2 дорожек и тротуаров	0,2114	0,2114		
		Объём: 105.7*0.2					
		1 ОТ				266,60	56,36
		3 ЭМ				322,22	68,12
		2 в т. ч. ОТм				42,03	8,89
		4 М				4 664,38	986,05
		ЗТ	чел.-ч	26,24	5,55		
		ЗТм	чел.-ч	3,17	0,67		
		Итого по расценке				5 253,20	1 110,53
60.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4	-3,67836	267,84	-985,21
		Объём: (0.2114)*(-17.4)					
		ФОТ					65,25

	Пр/812-021.1-1	НР	%	113		113		73,73
	Пр/774-021.1	СП	%	77		77		50,24
		Всего по позиции						249,29
61	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01(до толщ. 10 см К=-2)	100 м2 дорожек и тротуаров	0,2114		0,2114		
		Объём: 105.7*0.2						
		1 ОТ			-2		5,49	-2,32
		3 ЭМ			-2		8,53	-3,61
		2 в т. ч. ОТм			-2		1,21	-0,51
		4 М			-2		401,76	-169,86
		ЗТ	чел.-ч	0,54	-2	-0,23		
		ЗТм	чел.-ч	0,10	-2	-0,04		
		Итого по расценке					415,78	-175,79
61.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,5	-2	0,6342	267,84	169,86
		Объём: (0.2114)*(-1.5)						
		ФОТ						
	Пр/812-021.1-1	НР	%	113		113		-2,83
	Пр/774-021.1	СП	%	77		77		-3,20
		Всего по позиции						-2,18
62	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27,2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	2,66		2,66	111,89	-11,31
		Объём: 105.7*0.2*0.1*1.26						297,63
		Всего по позиции						297,63
63	ТЕР 27-02-010-02 табл.27.3 п.3.8, бетон К=0,86, раствор К=0,33 к стоимости материалов	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (поребрик П-5у)	100 м бортового камня	1,057		1,057		
		1 ОТ					772,97	817,03
		3 ЭМ					104,20	110,14
		2 в т. ч. ОТм					11,02	11,65
		4 М					3 677,44	3 887,05
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100		105,7		
		ЗТ	чел.-ч	76,08		80,42		
		ЗТм	чел.-ч	0,68		0,72		
		Итого по расценке					4 554,61	4 814,22

63.1	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,06	-0,06342	696,05		-44,14
		Объём: (1.057)*(-0.06)						
63.2	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-6,2363	594,11		-3 705,05
		Объём: (1.057)*(-5.9)						
63.3	ТССЦ 102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,17969	705,14		-126,71
		Объём: (1.057)*(-0.17)						
63.4	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001	-0,001057	10 557,18		-11,16
		Объём: (1.057)*(-0.001)						
63.5	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,68	0,719	510,93	0,86	367,36
		Объём: (1.057)*(((105.7/3*0.02*1.02))/1.057)						
63.6	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06	0,0634	229,70	0,33	14,56
		Объём: (1.057)*0.06						
63.7	ТССЦ 403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (по типу П5у V= 0,063/3=0,021 м3/1мп)	м3	2,1	2,22	2 012,95		4 468,75
		Объём: (1.057)*((105.7*0.021)/1.057)						
		ФОТ						828,68
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	147			1 218,16
	Пр/774-021.0	СП	%	95	95			787,25
		Всего по позиции						7 783,24
64	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,0541	-0,0541			
		Объём: -(6.2363/1.02-(105.7/3*0.02))						
		1 ОТ				1 686,60		-91,25
		3 ЭМ				2 609,79		-141,19
		2 в т. ч. ОТм				291,78		-15,79
		4 М				2 412,90		-130,54
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	-5,5182			
		ЗТ	чел.-ч	180,00	-9,74			
		ЗТм	чел.-ч	18,00	-0,97			
		Итого по расценке				6 709,29		-362,98
64.1	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	-0,200	0,0108187	1,98		0,02

		Объём: (-0.054093529)*(-0.2)						
64.2	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-249,970		13,5233823	9,65	130,50
		Объём: (-0.054093529)*(-250.0)						
		ФОТ						-107,04
	Пр/812-006.0-1	НР	%	102		102		-109,18
	Пр/774-006.0	СП	%	58		58		-62,08
		Всего по позиции						-403,72
65	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 20-40мм) толщ.16см	100 м2 дорожек и тротуаров	1,439		1,439		
		1 ОТ					266,60	383,64
		3 ЭМ					322,22	463,67
		2 в т. ч. ОТм					42,03	60,48
		4 М					4 664,38	6 712,04
		ЗТ	чел.-ч	26,24		37,76		
		ЗТм	чел.-ч	3,17		4,56		
		Итого по расценке					5 253,20	7 559,35
65.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4		-25,0386	267,84	-6 706,34
		Объём: (1.439)*(-17.4)						
		ФОТ						444,12
	Пр/812-021.1-1	НР	%	113		113		501,86
	Пр/774-021.1	СП	%	77		77		341,97
		Всего по позиции						1 696,84
66	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01(до толщ. 16 см К=4)	100 м2 дорожек и тротуаров	1,439		1,439		
		1 ОТ			4		5,49	31,60
		3 ЭМ			4		8,53	49,10
		2 в т. ч. ОТм			4		1,21	6,96
		4 М			4		401,76	2 312,53
		ЗТ	чел.-ч	0,54	4	3,11		
		ЗТм	чел.-ч	0,10	4	0,58		
		Итого по расценке					415,78	2 393,23
66.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,5	4	-8,634	267,84	-2 312,53
		Объём: (1.439)*(-1.5)						
		ФОТ						38,56
	Пр/812-021.1-1	НР	%	113		113		43,57
	Пр/774-021.1	СП	%	77		77		29,69

		Всего по позиции						153,96
67	ТССЦ 409-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000	м3	29,01		29,01	105,16	3 050,69
		Объём: 143.9*0.16*1.26						
		Всего по позиции						3 050,69
68	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-10мм) толщ.10см	100 м2 дорожек и тротуаров	1,439		1,439		
		1 ОТ					266,60	383,64
		3 ЭМ					322,22	463,67
		2 в т. ч. ОТм					42,03	60,48
		4 М					4 664,38	6 712,04
		ЗТ	чел.-ч	26,24		37,76		
		ЗТм	чел.-ч	3,17		4,56		
		Итого по расценке					5 253,20	7 559,35
68.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4		-25,0386	267,84	-6 706,34
		Объём: (1.439)*(-17.4)						
		ФОТ						444,12
	Пр/812-021.1-1	НР	%	113		113		501,86
	Пр/774-021.1	СП	%	77		77		341,97
		Всего по позиции						1 696,84
69	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01(до толщ. 10 см К=-2)	100 м2 дорожек и тротуаров	1,439		1,439		
		1 ОТ			-2		5,49	-15,80
		3 ЭМ			-2		8,53	-24,55
		2 в т. ч. ОТм			-2		1,21	-3,48
		4 М			-2		401,76	-1 156,27
		ЗТ	чел.-ч	0,54	-2	-1,55		
		ЗТм	чел.-ч	0,10	-2	-0,29		
		Итого по расценке					415,78	-1 196,62
69.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,5	-2	4,317	267,84	1 156,27
		Объём: (1.439)*(-1.5)						
		ФОТ						-19,28
	Пр/812-021.1-1	НР	%	113		113		-21,79
	Пр/774-021.1	СП	%	77		77		-14,85
		Всего по позиции						-76,99

70	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27,2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	18,13	18,13	111,89	2 028,57
		Объём: 143.9*0.1*1.26					
		Всего по позиции					2 028,57
71	ТЕР 27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа <VOGELE> малых типоразмеров толщиной слоя 4 см	1000 м2	0,1439	0,1439		
		1 ОТ				204,94	29,49
		3 ЭМ				4 375,98	629,70
		2 в т. ч. ОТм				126,32	18,18
		4 М				1,82	0,26
	ТССЦ 101-9010	Битум	т	0,65	0,093535		
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	П	П		
		ЗТ	чел.-ч	18,58	2,67		
		ЗТм	чел.-ч	7,98	1,15		
		Итого по расценке				4 582,74	659,45
71.1	ТССЦ 101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,65	0,093535	1 876,40	175,51
		Объём: (0.1439)*0.65					
71.2	ТССЦ 410-0006 Прим. норма а/б смеси по ТЕР27-07-001-01 с учетом корректировки толщины по ТЕР27-07-001-02	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	95,6	13,757	570,70	7 851,12
		Объём: (0.1439)*((1.439*(7.14+1.21*2))/0.1439)					
		ФОТ					47,67
	Пр/812-021.1-1	НР	%	113	113		53,87
	Пр/774-021.1	СП	%	77	77		36,71
		Всего по позиции					8 776,66
72	ТЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,14655	0,14655		
		Объём: 97.7*0.15					
		1 ОТ				797,39	116,86
		3 ЭМ					
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М					

		ЗТ	чел.-ч	88,50	12,97			
		ЗТм	чел.-ч					
		Итого по расценке					797,39	116,86
		ФОТ						116,86
	Пр/812-001.2-1	НР	%	89		89		104,01
	Пр/774-001.2	СП	%	40		40		46,74
		Всего по позиции						267,61
73	ТССЦ 407-0013	Земля растительная механизированной заготовки Объём: 97.7*0.15	м3	14,655	14,655		111,97	1 640,92
		Всего по позиции						1 640,92
	Ремонт отмостки Тип 3 S=172,5м2							
74	ТЕРр 68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,1725	0,1725			
		1 ОТ					577,02	99,54
		3 ЭМ					1 184,57	204,34
		2 в т. ч. ОТм					189,66	32,72
		4 М						
		ЗТ	чел.-ч	57,76	9,96			
		ЗТм	чел.-ч	15,70	2,71			
		Итого по расценке					1 761,59	303,88
74.1	ТССЦ 410-9014	Лом асфальтобетона Объём: (0.1725)*((172.5*0.04*1.98)/0.1725)	т	79,2	13,66			
		ФОТ						132,26
	Пр/812-102.0-1	НР	%	102	102			134,91
	Пр/774-102.0	СП	%	54	54			71,42
		Всего по позиции						510,21
75	ТССЦпг 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	13,66	13,66			
		1 ОТ					3,87	52,86
		3 ЭМ					0,39	5,33
		2 в т. ч. ОТм						
		4 М						
		ЗТ	чел.-ч					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	0,33			
		Итого по расценке					4,49	61,39
		ФОТ						5,33
		НР	%	100	100			5,33
		СП	%	60	60			3,20

		Всего по позиции					61,39
76	ТССЦпг 03-21-01-011	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км	1 т груза	13,66	13,66	13,55	185,09
		Всего по позиции					185,09
77	ТЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа	100 м3 грунта	0,083	0,083		
		Объём: 166.0*0.25*0.2					
		1 ОТ				1 442,98	119,77
		3 ЭМ					
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	154,00	12,78		
		ЗТм	чел.-ч				
		Итого по расценке					
		ФОТ				1 442,98	119,77
	Пр/812-001.2-1	НР	%	89	89		119,77
	Пр/774-001.2	СП	%	40	40		106,60
							47,91
		Всего по позиции					274,28
78	ТЕР 46-08-044-02	Гидроструйная очистка бетонных поверхностей	1 м2 поверхности	41,5	41,5		
		Объём: 166.0*0.25					
		1 ОТ				1,54	63,91
		3 ЭМ				0,59	24,49
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М				0,28	11,62
		ЗТ	чел.-ч	0,15	6,23		
		ЗТм	чел.-ч				
		Итого по расценке					
		ФОТ				2,41	100,02
	Пр/812-040.1-1	НР	%	103	103		63,91
	Пр/774-040.1	СП	%	59	59		65,83
							37,71
		Всего по позиции					203,56
79	ТЕР 08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхност	0,415	0,415		
		Объём: 166.0*0.25					
		1 ОТ				242,32	100,56

		3 ЭМ				77,87	32,32
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М				1 604,98	666,07
		ЗТ	чел.-ч	21,20	8,80		
		ЗТм	чел.-ч				
		Итого по расценке				1 925,17	798,95
		ФОТ					100,56
	Пр/812-008.0-1	НР	%	110	110		110,62
	Пр/774-008.0	СП	%	69	69		69,39
		Всего по позиции					978,96
80	ТЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,083	0,083		
		1 ОТ				797,39	66,18
		3 ЭМ					
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	88,50	7,35		
		ЗТм	чел.-ч				
		Итого по расценке				797,39	66,18
		ФОТ					66,18
	Пр/812-001.2-1	НР	%	89	89		58,90
	Пр/774-001.2	СП	%	40	40		26,47
		Всего по позиции					151,55
81	ТЕР 27-07-002-01 прим.	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-20мм) (под тротуарные бордюры: фр. 5-20мм В=20см, Н=10см)	100 м2 дорожек и тротуаров	0,3444	0,3444		
		Объём: 172.2*0.2					
		1 ОТ				266,60	91,82
		3 ЭМ				322,22	110,97
		2 в т. ч. ОТм				42,03	14,48
		4 М				4 664,38	1 606,41
		ЗТ	чел.-ч	26,24	9,04		
		ЗТм	чел.-ч	3,17	1,09		
		Итого по расценке				5 253,20	1 809,20
81.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4	-5,993	267,84	-1 605,17
		Объём: (0.3444)*(-17.4)					
		ФОТ					106,30
	Пр/812-021.1-1	НР	%	113	113		120,12

	Пр/774-021.1	СП	%	77		77		81,85
		Всего по позиции						406,00
82	ТЕР 27-07-002-02 прим.	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01(до толщ. 10 см К=-2)	100 м2 дорожек и тротуаров	0,3444		0,3444		
		Объём: 172.2*0.2						
		1 ОТ			-2		5,49	-3,78
		3 ЭМ			-2		8,53	-5,88
		2 в т. ч. ОТм			-2		1,21	-0,83
		4 М			-2		401,76	-276,73
		ЗТ	чел.-ч	0,54	-2	-0,37		
		ЗТм	чел.-ч	0,10	-2	-0,07		
		Итого по расценке						
82.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,5	-2	1,0332	415,78	-286,39
		Объём: (0.3444)*(-1.5)					267,84	276,73
		ФОТ						-4,61
	Пр/812-021.1-1	НР	%	113		113		-5,21
	Пр/774-021.1	СП	%	77		77		-3,55
		Всего по позиции						-18,42
83	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27,2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	4,34		4,34	111,89	485,60
		Объём: 172.2*0.2*0.1*1.26						
		Всего по позиции						485,60
84	ТЕР 27-02-010-02 табл.27.3 п.3.8, бетон К=0,86, раствор К=0,33	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (поребрик П-5у)	100 м бортового камня	1,722		1,722		
		1 ОТ					772,97	1 331,05
		3 ЭМ					104,20	179,43
		2 в т. ч. ОТм					11,02	18,98
		4 М					3 677,44	6 332,55
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100		172,2		
		ЗТ	чел.-ч	76,08		131,01		
		ЗТм	чел.-ч	0,68		1,17		
		Итого по расценке					4 554,61	7 843,03
84.1	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,06		-0,10332	696,05	-71,92
		Объём: (1.722)*(-0.06)						

84.2	ТССЦ 102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,17	-0,29274	705,14		-206,42
		Объём: (1.722)*(-0.17)						
84.3	ТССЦ 101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001	-0,001722	10 557,18		-18,18
		Объём: (1.722)*(-0.001)						
84.4	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9	-10,16	594,11		-6 036,16
		Объём: (1.722)*-5.9						
84.5	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06	0,1033	229,70	0,33	23,73
		Объём: (1.722)*0.06						
84.6	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0,680	1,171	510,93	0,86	598,30
		Объём: (1.722)*((172.23/3*0.02*1.02)/1.722)						
84.7	ТССЦ 403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (по типу П5у V= 0,063/3=0,021 м3/1мп)	м3	2,1	3,616	2 012,95		7 278,83
		Объём: (1.722)*((172.2*0.021)/1.722)						
		ФОТ						1 350,03
	Пр/812-021.0-1	НР	%	147	147			1 984,54
	Пр/774-021.0	СП	%	95	95			1 282,53
		Всего по позиции						12 678,28
85	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,0881	-0,0881			
		Объём: -(10.16/1.02-(172.2/3*0.02))						
		1 ОТ				1 686,60		-148,59
		3 ЭМ				2 609,79		-229,92
		2 в т. ч. ОТм				291,78		-25,71
		4 М				2 412,90		-212,58
	ТССЦ 401-9021	Бетон	м3	102	-8,9862			
		ЗТ	чел.-ч	180,00	-15,86			
		ЗТм	чел.-ч	18,00	-1,59			
		Итого по расценке				6 709,29		-591,09
85.1	ТССЦ 411-0001	Вода	м3	-0,200	0,0176256	1,98		0,03
		Объём: (-0.088127843)*(-0.2)						
85.2	ТССЦ 101-1668	Рогожа	м2	-250,079	22,0319608	9,65		212,61
		Объём: (-0.088127843)*(-250.0)						
		ФОТ						-174,30

	Пр/812-006.0-1	НР	%	102		102		-177,79
	Пр/774-006.0	СП	%	58		58		-101,09
		Всего по позиции						-657,33
86	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (фр. 5-10мм)	100 м2 дорожек и тротуаров	1,725		1,725		
		1 ОТ					266,60	459,89
		3 ЭМ					322,22	555,83
		2 в т. ч. ОТм					42,03	72,50
		4 М					4 664,38	8 046,06
		ЗТ	чел.-ч	26,24		45,26		
		ЗТм	чел.-ч	3,17		5,47		
		Итого по расценке					5 253,20	9 061,78
86.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-17,4		-30,015	267,84	-8 039,22
		Объём: (1.725)*(-17.4)						
		ФОТ						532,39
	Пр/812-021.1-1	НР	%	113		113		601,60
	Пр/774-021.1	СП	%	77		77		409,94
		Всего по позиции						2 034,10
87	ТЕР 27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01(до толщ. 10 см К=-2)	100 м2 дорожек и тротуаров	1,725		1,725		
		1 ОТ			-2		5,49	-18,94
		3 ЭМ			-2		8,53	-29,43
		2 в т. ч. ОТм			-2		1,21	-4,17
		4 М			-2		401,76	-1 386,07
		ЗТ	чел.-ч	0,54	-2	-1,86		
		ЗТм	чел.-ч	0,10	-2	-0,35		
		Итого по расценке					415,78	-1 434,44
87.1	ТССЦ 408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,5	-2	5,175	267,84	1 386,07
		Объём: (1.725)*(-1.5)						
		ФОТ						-23,11
	Пр/812-021.1-1	НР	%	113		113		-26,11
	Пр/774-021.1	СП	%	77		77		-17,79
		Всего по позиции						-92,27
88	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР27 прил.27,2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	21,74		21,74	111,89	2 432,49

		Объём: 172.5*0.1*1.26					
		Всего по позиции					
89	ТЕР 27-07-001-04	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	1,725	1,725		2 432,49
		1 ОТ				118,03	203,60
		3 ЭМ				73,39	126,60
		2 в т. ч. ОТм				0,32	0,55
		4 М				4 053,01	6 991,44
		ЗТ	чел.-ч	10,21	17,61		
		ЗТм	чел.-ч	0,02	0,03		
		Итого по расценке				4 244,43	7 321,64
89.1	ТССЦ 410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-7,14	-12,3165	551,88	-6 797,23
		Объём: (1.725)*(-7.14)					
		ФОТ					204,15
	Пр/812-021.1-1	НР	%	113	113		230,69
	Пр/774-021.1	СП	%	77	77		157,20
		Всего по позиции					912,30
90	ТЕР 27-07-001-02 Прим.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01(до толщ. 4 см к=2)	100 м2 покрытия	3,45	3,45		
		Объём: 2*172.5					
		1 ОТ				25,89	89,32
		3 ЭМ				11,75	40,54
		2 в т. ч. ОТм				667,77	2 303,81
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	2,32	8,00		
		ЗТм	чел.-ч				
		Итого по расценке				705,41	2 433,67
90.1	ТССЦ 410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-1,21	-4,1745	551,88	-2 303,82
		Объём: (3.45)*(-1.21)					
		ФОТ					89,32
	Пр/812-021.1-1	НР	%	113	113		100,93
	Пр/774-021.1	СП	%	77	77		68,78
		Всего по позиции					299,56

91	ТССЦ 410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	16,491	16,491	570,70	9 411,41
		Объём: 1.725*(7.14+1.21*2)					
		Всего по позиции					9 411,41
92	ТЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,2575	0,2575		
		Объём: 171.7*0.15					
		1 ОТ				797,39	205,33
		3 ЭМ					
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	88,50	22,79		
		ЗТм	чел.-ч				
		Итого по расценке					
		ФОТ				797,39	205,33
	Пр/812-001.2-1	НР	%	89	89		205,33
	Пр/774-001.2	СП	%	40	40		182,74
		Всего по позиции					82,13
93	ТССЦ 407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	25,76	25,76	111,97	470,20
		Объём: 171.7*0.15					2 884,35
		Всего по позиции					2 884,35
		Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен)					234 909,60
		в том числе					
		оплата труда					8 337,57
		эксплуатация машин и механизмов					21 184,05
		материальные ресурсы					198 932,79
		перевозка					6 455,19
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)					10 405,63
Раздел 2. Благоустройство							
	Установка скамьи, урны						
94	ТЕР 46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	1 т металлокон струкций	0,25185	0,25185		
		Объём: 5*(4*0.617*0.15+50)/1000					
		1 ОТ				934,13	235,26
		3 ЭМ				198,42	49,97
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М				88,00	22,16

	ТССЦ 201-9005	Конструкции металлические мелкие	т	1	0,25185		
		ЗТ	чел.-ч	84,69	21,33		
		ЗТм	чел.-ч				
		Итого по расценке					
94.1	ТССЦ 204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	0,007	0,002	1 220,55 5 935,52	307,39 11,87
		Объём: (0.25185)*((5*(4*0.617*0.15)/1000)/0.25185)					
94.2	ТССЦ 116-0079	Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)	шт.	19,853	5	1 296,47	6 482,35
		Объём: (0.25185)*(5.0/0.25185)					
		ФОТ					235,26
	Пр/812-040.1-1	НР	%	103	103		242,32
	Пр/774-040.1	СП	%	59	59		138,80
		Всего по позиции					7 182,73
95	ТЕР 46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	1 т металлоконструкций	0,07974	0,07974		
		Объём: 5*(4*1.58*0.15+15)/1000					
		1 ОТ				934,13	74,49
		3 ЭМ				198,42	15,82
		2 в т. ч. ОТм				88,00	7,02
		4 М					
	ТССЦ 201-9005	Конструкции металлические мелкие	т	1	0,07974		
		ЗТ	чел.-ч	84,69	6,75		
		ЗТм	чел.-ч				
		Итого по расценке					
95.1	ТССЦ 204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	0,023	0,00185	1 220,55 5 935,52	97,33 10,98
		Объём: (0.07974)*((5*(4*0.617*0.15)/1000)/0.07974)					
95.2	ТССЦ 116-0093	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт.	62,704	5	315,35	1 576,75
		Объём: (0.07974)*(5.0/0.07974)					
		ФОТ					74,49
	Пр/812-040.1-1	НР	%	103	103		76,72
	Пр/774-040.1	СП	%	59	59		43,95
		Всего по позиции					1 805,73
		Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном уровне цен)					8 486,67
		в том числе					
		оплата труда					309,75

	эксплуатация машин и механизмов				
	материальные ресурсы	65,79			
	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	8 111,13			
		309,75			
	ВСЕГО по смете				
	ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)	259 815,03	11,76	3 055 425	
	ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)	6 455,19	11,76	75 913	
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)	266 270,22		3 131 338	
	Строительный контроль 2,14%	*5 698*		*67 011*	
	Итого	*271 968*		*3 198 349*	
	Непредвиденные затраты 2%	5 439	2	*63 967*	
	Итого	277 408		*3 262 316*	
Мин.экон. Развития РФ	Итого с прогнозным индексом-дефлятором на 2022г и на плановый 2023 и 2024гг (строительство, ИЦП)-104,3%	289 336	1,043	*3 402 595*	

Материалы									
Компенсация при УСН на материалы									
Всего возмещение	0,2	207043,92	11,76	1,043					507 906,89
Всего ТЦ									**507 906,89**
Всего по смете	**1,033699199**								3 910 502,07
									4 042 282,86

Согласно протокола от 13.10.2022г. №8 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом снижения сумма по смете (К=4042282,86/3910502,07=1,033699199)

Составил: Зарудняева Н. А

Проверил:

СОГЛАСОВАНО:
Подрядчик:
Директор
ООО "НК-Стройпродукт"
_____ Заруднева Н.А.

УТВЕРЖДАЮ:
Заказчик:
Директор
ООО УК "Престиж-НК"
_____ Каширина С.С.

Ведомость объемов

на благоустройство дворовой территории по адресу
г. Новокузнецк, ул. Ленина, 15 (минимальный перечень работ)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
	Раздел 1. Ремонт дворовых проездов.		
1	Разборка бортовых камней П-1у на щебеночном основании (119,8*0,125)	м.п.	119,8
		тн	14,98
2	Погрузочные работы	тн	14,98
3	Срезка а/б покрытия фрезой(В=1000мм, Н=7см) (263,3*0,07*1,98)	м2/т	263,3/36,49
4	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (11км) (14,98+36,49)	тн	51,47
5	Разработка грунта для устройства траншеи Т1 вручную, глубиной 0,9 м	м3	1,6
6	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр 5-10 под дорожные бордюры В=30см, Н=15 см	м3	26,2
		м2	3,93
7	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.:		
8	П-1у (объем 1м.п.-0,0525м3)	м.п.	87,4
9	Устройство песчаного основания	м3	0,5
10	Прокладка асбестоцементной трубы, диаметром 50-100мм	м	6,0
11	Обратная засыпка траншеи	м3	1,1
12	Устройство выравнивающего слоя из шлакового щебня фр.5-10см, Н=5 см коэф.упл. щебня - 1,26	м3	8,6
13	Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона толщ.4см, Марки II, тип Б	м2	172,8
14	Розлив битума (172,8*0,0005)	тн	0,1
15	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона толщ. 4см, Марки II, тип Б, по ГОСТ 9128-2013	м2	172,8

	Раздел 2. Ремонт парковки		
16	Валка деревьев (береза), диаметром до 24 см	шт.	1
		м3	0,54
17	Корчевка пней, диаметром до 32 см	шт.	2
		м3	0,20
18	Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фр.40-70	шт.	2
		м3	0,20
19	Погрузка и перевозка строительного мусора (0,54+0,2)*0,61	тн	0,449
20	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (797,2*0,25)	м3	199,3
21	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (797,2*0,25*1,4)	тн	279,0
22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т	тн	279,0
23	Разработка грунта для устройства траншеи Т1 вручную, глубиной 0,9 м	м3	2,5
24	Устройство песчаного основания	м3	0,8
25	Прокладка асбестоцементной трубы, диаметром 50-100мм	м	14,0
26	Обратная засыпка траншеи	м3	1,7
27	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр 5-10 под дорожные бордюры В=30см, Н=15 см	м2	34,2
		м3	5,13
28	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.:		
29	П-1у(объем 1м.п.-0,0525м3)	м.п.	114,1
30	Устройство выравнивающего слоя из шлакового щебня по ГОСТ 3344-83фр.40-70см, Н=15 см	м3	118,1
31	Устройство выравнивающего слоя из шлакового щебня по ГОСТ 3344-83фр.20-40см, Н=7 см	м3	55,1
32	Устройство выравнивающего слоя из шлакового щебня по ГОСТ 3344-83фр.5-10см, Н=1 см	м3	7,9
33	Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона толщ. 4см, Марки II, тип Б	м2	787,2
34	Розлив битума (787,2*0,0005)	тн	0,4
35	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона толщ. 4см, Марки II, тип Б, по ГОСТ 9128- 2013	м2	787,2

36	Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней растительной земли Н=15см	м2	96,3
	Раздел 3. Ремонт тротуара (восстановленный)		
37	Разборка а/б покрытия отб.молотком(тротуар) (13,0*0,04*1,98)	м2	13,0
		тн	1,03
38	Разборка бортовых камней П-5у на щебеночном основании	м.п.	9,0
39	Погрузочные работы 9,0*0,05+13,0*0,04*1,98	тн	1,5
40	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (11км)	тн	1,5
41	Разборка цементно-бетонных покрытий (7,5*0,07)	м3	0,53
42	Погрузочные работы	тн	1,27
43	Перевозка строительного мусора	тн	1,27
44	Демонтаж б/у люка	шт.	1
45	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см	шт.	1
46	Установка нового чугунного шарнирного люка типа "Л"	шт.	1
47	Выемка дорожного основания (Н=10см) бульдозерами 2 гр	м2/м3	13,0/1,3
48	Погрузочные работы (1,3*1,4)	тн	1,82
49	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (11км)	тн	1,82
50	Устройство подстилающих слоев из щебня шлакового фр.5-10 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10 см коэф.упл. щебня - 1,26	м2	3,4
		м3	0,3
51	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.:		
52	П-5у (длина-3,0м, объем 1м.п.-0,021м3)	м.п.	17,2
53	Устройство основания из шлакового щебня фр.5-10,толщ.10см. коэф.упл. щебня - 1,26	м2	23,0
		м3	2,3
54	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона толщ.4см, Марки II, тип Б,фракции до 10мм (расход а/б на 100 м2 -9,56 тн.)	м2	23,0
	Раздел 4.Ремонт тротуара (проектируемый)		
55	Разборка бортовых камней П-5у на щебеночном основании	м.п.	60,0
56	Погрузочные работы 60,0*0,05	тн	3,0
57	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (11км)	тн	3,0
58	Устройство подстилающих слоев из щебня шлакового фр.5-10 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10 см	м2	21,1

	коэф.упл. щебня - 1,26	м3	2,1
59	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.:		
60	П-5у(длина-3,0м, объем 1м.п.-0,021м3)	м.п.	105,7
61	Устройство выравнивающего слоя из шлакового щебня по ГОСТ 3344-83 фр.20-40см, Н=16 см	м3	23,02
62	Устройство выравнивающего слоя из шлакового щебня по ГОСТ 3344-83 фр.5-10см, Н=10 см	м3	14,39
63	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона толщ.4см, Марки II, тип Б,фракции до 10мм (расход а/б на 100 м2 -9,56 тн.)	м2	143,9
64	Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней растительной земли Н=15см	м2	97,7
	Раздел 5. Ремонт отмостки (восстанавливаемый)		
65	Разборка а/б покрытия отб.молотком(тротуар) (172,5*0,04)	м2	172,5
66	Погрузочные работы (6,9*1,98)	м3	6,9
67	Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (11км)	тн	13,7
		тн	13,7
68	Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.5-10 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10 см коэф.упл. щебня - 1,26	м2	34,4
		м3	3,4
69	Установка бортовых камней на щебеночном основании в т.ч.:		
70	П-5у (длина-3,0м, объем 1м.п.-0,021м3)	м.п.	172,2
71	Устройство 2-х слойной вертикальной гидроизоляции, высотой не менее 250мм. (166*0,25) с откапыванием фундамента	м2	41,5
72	Устройство выравнивающего слоя из шлакового щебня по ГОСТ 3344-83 фр.5-10см, Н=10 см	м3	17,3
73	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона толщ.4см, Марки II, тип Б,фракции до 10мм (расход а/б на 100 м2 -9,56 тн.)	м2	172,5
74	Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней растительной земли Н=15см	м2	171,7
	Раздел 6. Благоустройство дворовой территории		
75	Устройство урны	шт.	5
76	Устройство скамьи	шт	5

Составил: Зарудняева Н. А.

Проверил: Лесичкова Л. Г.
